


Districtwise Basic Water Supply Coverage at a glance



Data Source: DWSS (FY 2072-73)

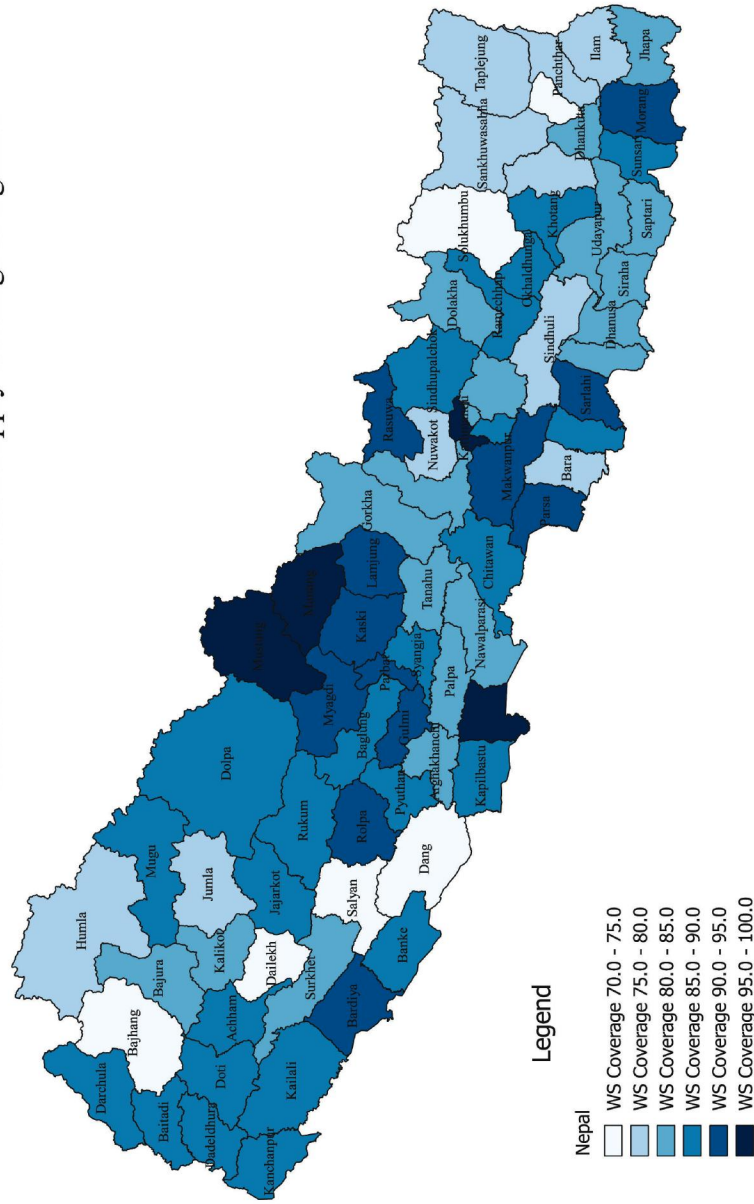

नेपाल सरकार

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय  
सिंहदरबार, काठमाडौं



दोस्रो चौमासिक  
तथा

अष्टमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४



नेपाल सरकार

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय

योजना, अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा  
सिंहदरबार, काठमाडौं



नेपाल सरकार

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय

**दोस्रो चौमासिक  
तथा  
अष्टमासिक प्रगति प्रतिवेदन**

आ.ब. २०७३/०७४

२०७४ वैशाख





नेपाल सरकार  
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय  
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।



माननीय मन्त्री, जीवन बहादुर शाही



माननीय राज्यमन्त्री, दिपक खड्का



सचिव, भीम प्रसाद उपाध्याय



## प्रगति प्रतिवेदन बारेमा

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका माननीय मन्त्री ज्यूको, अध्यक्षतामा मिति २०७३।१२।३१ मा यस मन्त्रालयको अष्टमासिक तथा दोश्रो चौमासिक प्रगति समिक्षा माननीय राज्यमन्त्रीज्यू, माननीय राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यज्यू, यस मन्त्रालयका सचिवज्यू, निकाय तथा आयोजनाका प्रमुख अधिकारी लगायत आमन्त्रित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको छ । उक्त समिक्षा कार्यक्रम यस मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकाय लगायत कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको यस आ.ब. को प्रगति (भौतिक र वित्तिय), हासिल मुख्य उपलब्धी, समस्या तथा सामाधानका उपायहरु लगायतका विषयहरुमा समिक्षा सम्पन्न भएको छ । समष्टटिगत रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको दोश्रो चौमासिक अवधिको भौतिक प्रगति ६९.९४% र वित्तिय प्रगति ४८.२९% भने अष्टमासिक अवधिको भौतिक प्रगति ६६.०८% र वित्तिय प्रगति ४७.०९% रहेको छ । प्रगति स्थितिलाई सुधार्दै जाने र अबको तेस्रो चौमासिक अवधिमा योजना तथा कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न सबै निकाय तथा कार्यालय कटिबद्ध र प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने साथै खानेपानी तथा सरसफाइ जनताको भौलिक हकको रुपमा समेत रहेको हुँदा गाउँ सहर र देशका जनतालाई खानेपानीको पहुँच पुऱ्याउने सबै सरोकारवाला लाग्नुपर्ने मन्त्रीज्यूको निर्देशन रहेको थियो । दोस्रो चौमासिक तथा अष्टमासिक भौतिक एवं वित्तिय लक्ष्य, प्रगति, कार्यक्रम संचालनमा देखा परेका समस्याहरु, सामाधानका उपायहरु एवं माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यू, माननीय रा.यो.आ.का सदस्यज्यू, श्रीमान सचिवज्यूवाट भएको निर्देशन समेत समावेश गरी यो प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशित गरिएको छ ।

अन्त्यमा सबै सरोकारवालाहरुको अमूल्य राय, सुझाव तथा सल्लाहको अपेक्षा गर्दै प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण माहानुभावहरुप्रति मन्त्रालय परिवार हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ ।

योजना अनुगमन तथा वैदशिक सहयोग समन्वय महाशाखा  
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय



## विषय सूची:

क्र.सं.	विषय	पेज नं.
१)	मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको बजेट स्थिति	१
२)	मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूको बजेट स्थिति	२
३)	आ.ब. २०७३।०७४ को रातो किताबमा प्रकाशित बजेट	३
	क. बजेट वृत्त चार्ट	६
	ख. बजेट स्तम्भ चार्ट	८
४)	मन्त्रालयको निकायगत दोश्रो चौमासिक बजेट र खर्च	१०
	क. बजेट र खर्च तालिका	१०
	ख. बजेट र खर्च स्तम्भ चार्ट	११
५)	दोश्रो चौमासिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति	१२
६)	मन्त्रालयको दोश्रो चौमासिक संक्षिप्त प्रगतिको विवरण	१२
७)	निकायगत दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण	१३
८)	मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको संक्षिप्त जानकारी तालिका	१४
९)	आ.ब. २०७३।०७४ को दोश्रो चौमासिक अवधिका उल्लेखनिय उपलब्धीहरू	१६
१०)	कार्यक्रम संचालनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानका उपायहरू	१९
११)	आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ मा फछ्यौट गर्नु पर्ने बेरजु विवरण	२१
१२)	सारांश तालिका	
	क. मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजानहरूको सारांश तालिका	२३
	ख. मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको सारांश तालिका	२६
१३)	मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यक्रमहरूको संक्षिप्त चिनारी विवरण	२७
१४)	माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय राज्यमन्त्रीज्यू तथा श्रीमान सचिव ज्यूबाट भएको निर्देशन	३४-३५
१५)	मन्त्रालयको संगठनिक विवरण	
	क. संगठन तालिका	३६
	ख. पदाधिकारी/कर्मचारीहरूको विवरण	३७
	ग. मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूको (जिम्मेवारी अधिकारहरूको जानकारी विवरण)	४०






**मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको बजेट स्थिति**  
(आ.व. २०७३।७४)

सि. नं.	निकायहरू/ कार्यालयहरू	बजेट रु हजारमा				जम्मा
		नेपाल सरकार विनियोजन	वैदेशिक ऋण अनुदान / विनियोजन	वित्तिय व्यवस्था		
				नेपाल सरकार	वैदेशिक	
१	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय	२७,८४,१९				२७,८४,१९
२	श्री खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	८,३६,१४,१३	अनुदान:- ३९,३२,४३ ऋण- ५,२४,८२,६७			१४,००,२९,२३
३	श्री मेलम्ची खानेपानी विकास समिति	२,०७,०३,०२	ऋण-३,९१,४६,२७			५,९८,४९,२९
४	श्री आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय			१,७७,४४,८४	ऋण - ६,१२,४४,३६	७,८९,८९,२०
५	श्री काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड			७२,००,००		७२,००,००
६	श्री नेपाल खानेपानी संस्थान			१,४६,३२,००		१,४६,३२,००
७	श्री ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति	२०,१२,६९	अनुदान:-५०,०८,६९ ऋण-१,१०,५९,७१			१,८०,८१,०९
	<b>जम्मा</b>	<b>२२,०७,४३,८० (विनियोजन)</b>		<b>१०,०८,२१,२० (वित्तिय)</b>		<b>३२,१५,६५,००</b>

**निकायगत बजेट**

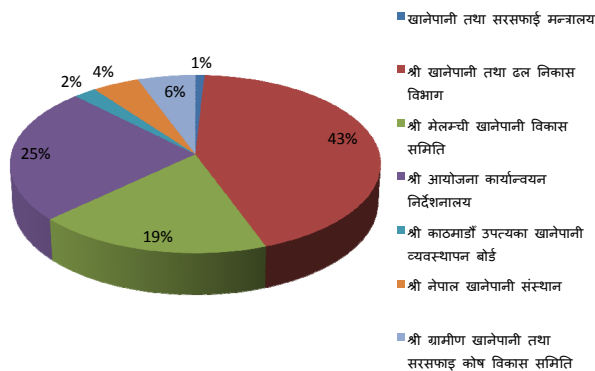

नेपाल सरकार  
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय

क्र. सं.	बजेट उ.शी नं	आयोजनाको प्रथमिकता	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वार्षिक बजेट
१	३१३११६	p1	वातावरणीय सरसफाई आयोजना	३५९१५५
२	३१३१०१	p3	राष्ट्रिय सुचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन आयोजना	१३१६१
३	३१३१०२	p1	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रम	९५३०५७
४	३१३१०३	p1	डिप ट्यूबल आयोजना (मर्मत सुधार)	८९४३६
५	३१३१०४	p2	जनसाधन विकास कार्यक्रम	४१६४३
६	३१३१०६	p1	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	४०५५४२
७	३१३१०९	p1	जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनिकरण तथा उपयुक्त प्रविधि प्रवर्द्धन आयोजना	१०११८२
८	३१३११०	p1	ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम	२०२१३९
९	३१३१०७	p1	दोश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	३६०४५५
१०	३१३१११	p1	खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कार्यक्रम	८१२४९९
११	३१३११२	p1	सुक्खाक्षेत्र (रामेछाप बृहत, पकरवास, तिमाल र यासोक) खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	६०९८३३
१२	३१३११३	p1	तराइ मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम	३००५५८
१३	३१३१०८	p1	तेश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	१६८०६२४
१४	३१३८०१	p1	ग्रामीण खानेपानी आयोजना	४५०००
१५	३१३८०२	p1	खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	७०८०९९०
१६	३१३८०३	p1	उच्च/मध्यमस्तरिय ठूला खानेपानी आयोजनाहरू	८२५०००
१७	३१३०१२	p1	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	१२२६४९
१८	५०११२८	p1	काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	६४००००
१९	५०११७७	p1	ढल प्रशोधन केन्द्र	८००००
२०	३१३११४	p1	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	५९८४९२९
२१	३१३११५	p1	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	१८०८१०९
२२	५०११३५	p3	काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना निर्देशनालय	३२००००
२३	५०११४५ (क)	p1	काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	२०५४०५०
	५०११४५ (ख)		काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना (Additional Financing)	२४७६९६४
२४	५०११६७	p1	काठमाण्डौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	३०४७९०६
२५	५०११२६	p2	खानेपानी उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम	१३२२७००
२६	५०११२७	p2	खानेपानी तथा ढल निकास कार्यक्रम	१४०५००
२७	३१३०११	p1	खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय	२७८४१९
<b>जम्मा</b>				<b>३२१५६५००</b>

**खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय**  
**आ.व. २०७३-०७४ को रातो किताबमा प्रकाशित बजेट**

(रकम रु. हजारमा)

ब.उ.शि.नं	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	चालु	पूँजीगत	वित्तीय	जम्मा	ने.स.	अनुदान	ऋण
३१३०११	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय	४७,१७९	२३१,२४०		२७८,४१९	२७८,४१९		
	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग							
३१३०१२	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	७८,६०९	४४,०४०	०	१२२,६४९	१२२,६४९		
३१३११६	वातावरणीय सरसफाई आयोजना	१७१,५५५	१८७,६००	०	३५९,१५५	२८६,२५५	७२९,००	
३१३१०१	राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन आयोजना	१३,१११	५०	०	१३,१६१	११,१६१	२०००	
३१३१०२	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम	१,९५७	९५१,१००	०	९५३,०५७	९४१,८०७	११२५०	
३१३१०३	डीप ट्युबवेल आयोजना (मर्मत सुधार)	५२६	८८,९१०	०	८९,४३६	८९,४३६	०	
३१३१०४	जनसाधन विकास कार्यक्रम	२०,६४३	२१,०००		४१,६४३	४१,६४३	०	
३१३१०६	खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	५,५४२	४००,०००	०	४०५,५४२	३८१,५४२	२४०००	
३१३१०९	जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनिकरण तथा उपयुक्त प्रविधि प्रवर्धन कार्यक्रम	१,१८२	१००,०००	०	१०१,१८२	१०१,१८२		
३१३११०	ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम	२,१३९	२००,०००	०	२०२,१३९	२०२,१३९		
३१३१०७	दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	४४,६५९	३१५,७९६	०	३६०,४५५	१२२,४३५	२३८०२०	
३१३१११	खानेपानी तथा सरसफाई सह लगानी कार्यक्रम	१४,५५९	७९७,९४०	०	८१२,४९९	८१२,४९९		
३१३११२	सुख्खा क्षेत्र खानेपानी आयोजना (रामेछाप वृहत, पकरवास, तिमाल र यासोक)	१५,९७४	५९३,८५९	०	६०९,८३३	६०९,८३३		
३१३११३	तराई-मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम	५५८	३००,०००	०	३००,५५८	३००,५५८		
३१३१०८	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा	६०,५१३	१,६२०,१११		१,६८०,६२४	४३२,२८४	७३	१२४८२६७


चौमासिक तथा अष्टमासिक प्रतिवेदन ३

ब.उ.शि.नं	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	चालु	पूँजीगत	वित्तीय	जम्मा	ने.स.	अनुदान	ऋण
	सरसफाई आयोजना							
३१३८०१	ग्रामीण खानेपानी आयोजना	०	४५,०००	०	४५,०००		४५,०००	
३१३८०२	खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम	६४४,८३६	६,४३६,१५४	०	७,०८०,९९०	३,०८०,९९०		४००००००
३४७८०५	उच्च मध्यम स्तरीय ठूला खानेपानी आयोजनाहरु	०	८२५,०००	०	८२५,०००	८२५,०००		
	खानेपानी विभागको जम्मा	१,०७६,३६३	१२,९२६,५६०	०	१४,००२,९२३	८,३६१,४१३	३९३,२४३	५,२४८,२६७
	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष							
३१३११५	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष	१२५,८१२	१,६८२,२९७		१,८०८,१०९	२०१,२६९	५००,८६९	११०५,९७१
	मेलम्ची खानेपानी विकास समिति							
३१३११४	*मेलम्ची खानेपानी आयोजना	७३,११३	५,९११,८१६	०	५,९८४,९२९	२,०७०,३०२		३९१,४६२७
	जम्मा	१,३२२,४६७	२०,७५१,९१३	०	२२,०७४,३८०	१०,९११,४०३	८९४,११२	१०,२६८,८६५
	सिलिङ्	१४३७४००	१३५८१९२४		१५०१९३२४	८६८२९८६	३४१६१९	५९९४७१९
	फरक	-११४,९३३	७,१६९,९८९	०	७,०५५,०५६	२,२२८,४१७	५५२,४९३	४,२७४,१४६

वित्तीय व्यवस्था तर्फ								
	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड		जम्मा	ने.स.	अनुदान	ऋण	निश्चित कार्यक्षेत्र तोकिएका आयोजनाहरू	३,४०४,८७५
५०११७७	ढल प्रशोधन केन्द्र		८००००	८००००			मेलम्ची र निश्चित कार्यक्षेत्र बाहेक अन्यको जम्मा	२२,७६६,६९६
५०११२८	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड		६४००००	६४००००				
	जम्मा		७२००००	७२००००				
	<b>नेपाल खानेपानी संस्थान</b>							
५०११२६	खानेपानी उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम		१३२२७००	१३२२७००				
५०११२७	खानेपानी तथा ढल निकास कार्यक्रम				१४०५००	१४०५००		
	जम्मा				१४६३२००	१४६३२००		
	<b>आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय</b>							
५०११३५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना निर्देशनालय				३२०,०००	१०५,५९९		२१४४०१
५०११४५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना				४५३१०१४	७२४४५५		३८०६५५९
५०११६७	काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना				३,०४७,९०६	९४४,४३०		२,१०३,४७६
	जम्मा				७,८९८,९२०	१,७७४,४८४	०	६,१२४,४३६


## बजेट वृत्त चार्ट

### चालु बजेट

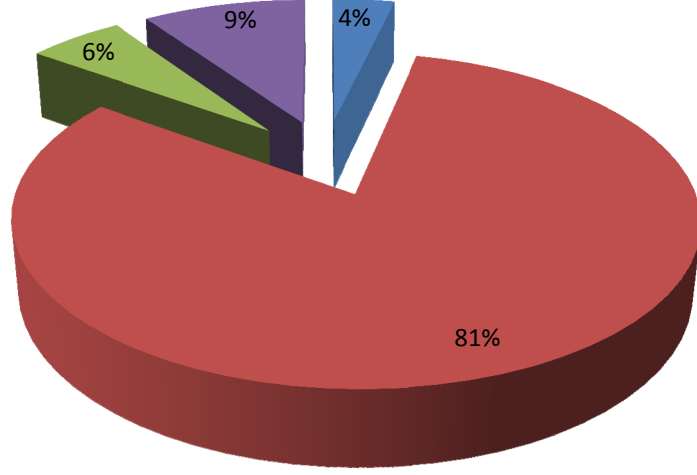


- खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय
- खानेपानी तथा ढल निकास विभाग
- मेलम्ची खानेपानी विकास समिति
- ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति

### पूँजीगत बजेट

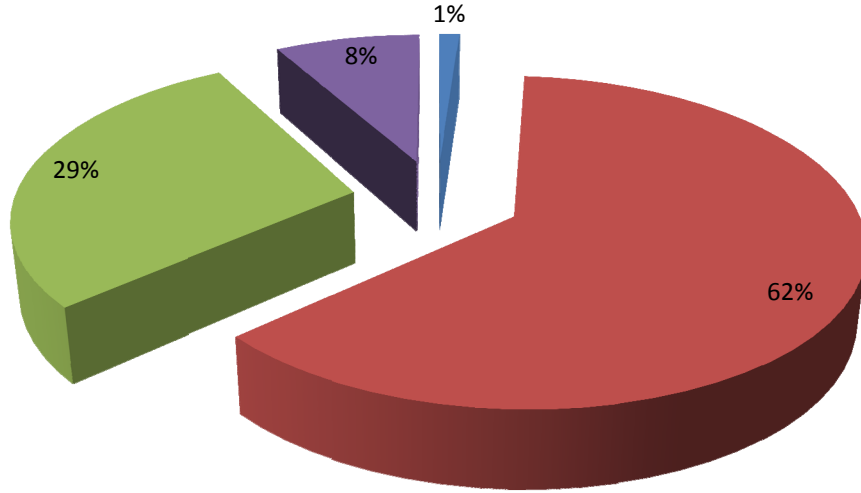


- खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय
- खानेपानी तथा ढल निकास विभाग
- मेलम्ची खानेपानी विकास समिति
- ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति

### विनियोजन तर्फको बजेट

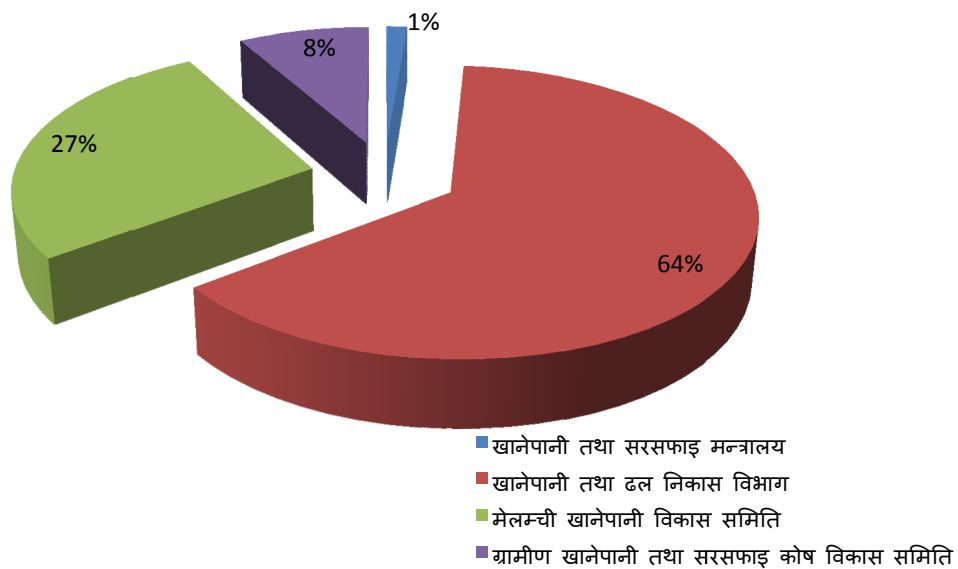


### वित्तीय तर्फको बजेट

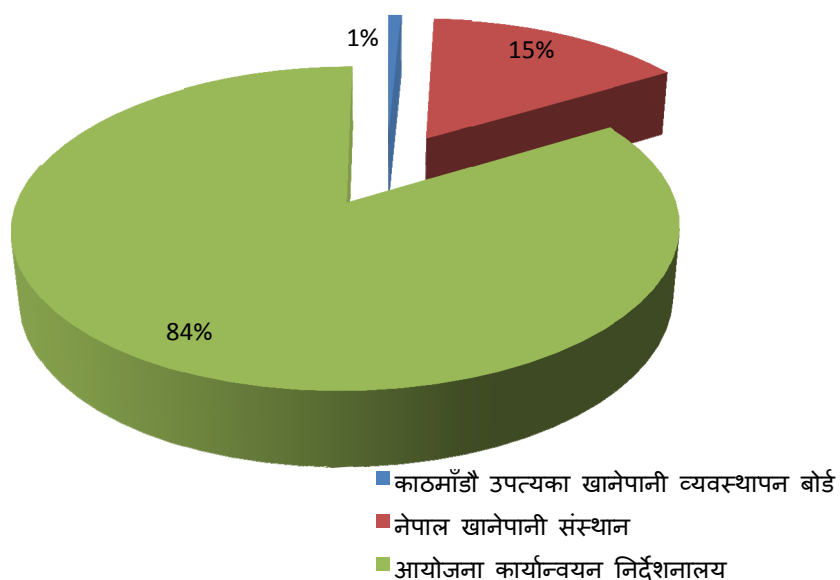




## बजेट स्तम्भ चार्ट

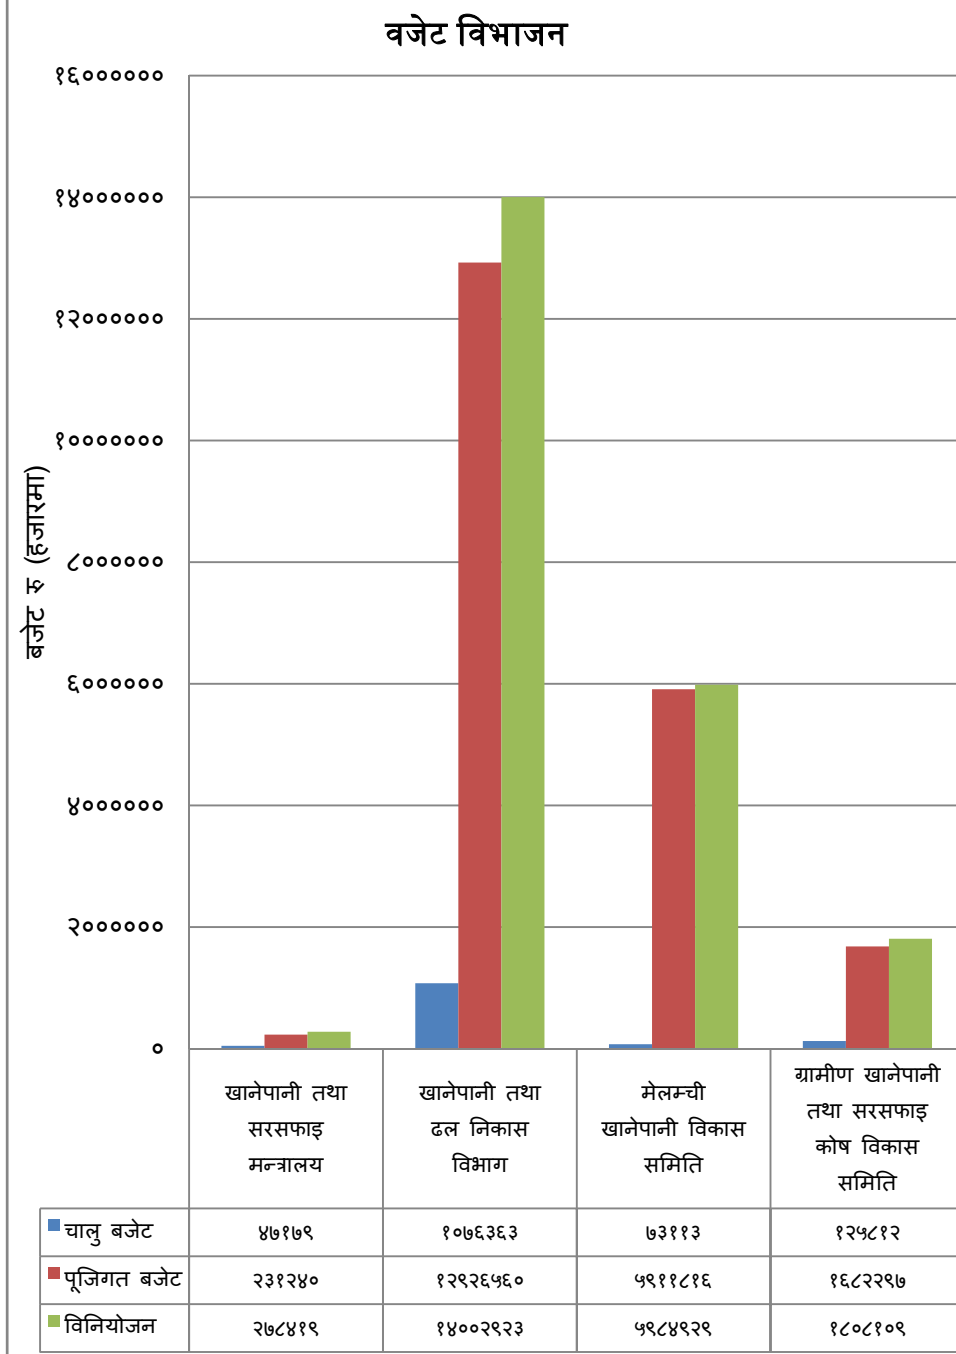


### वित्तीय व्यवस्था तर्फको बजेट

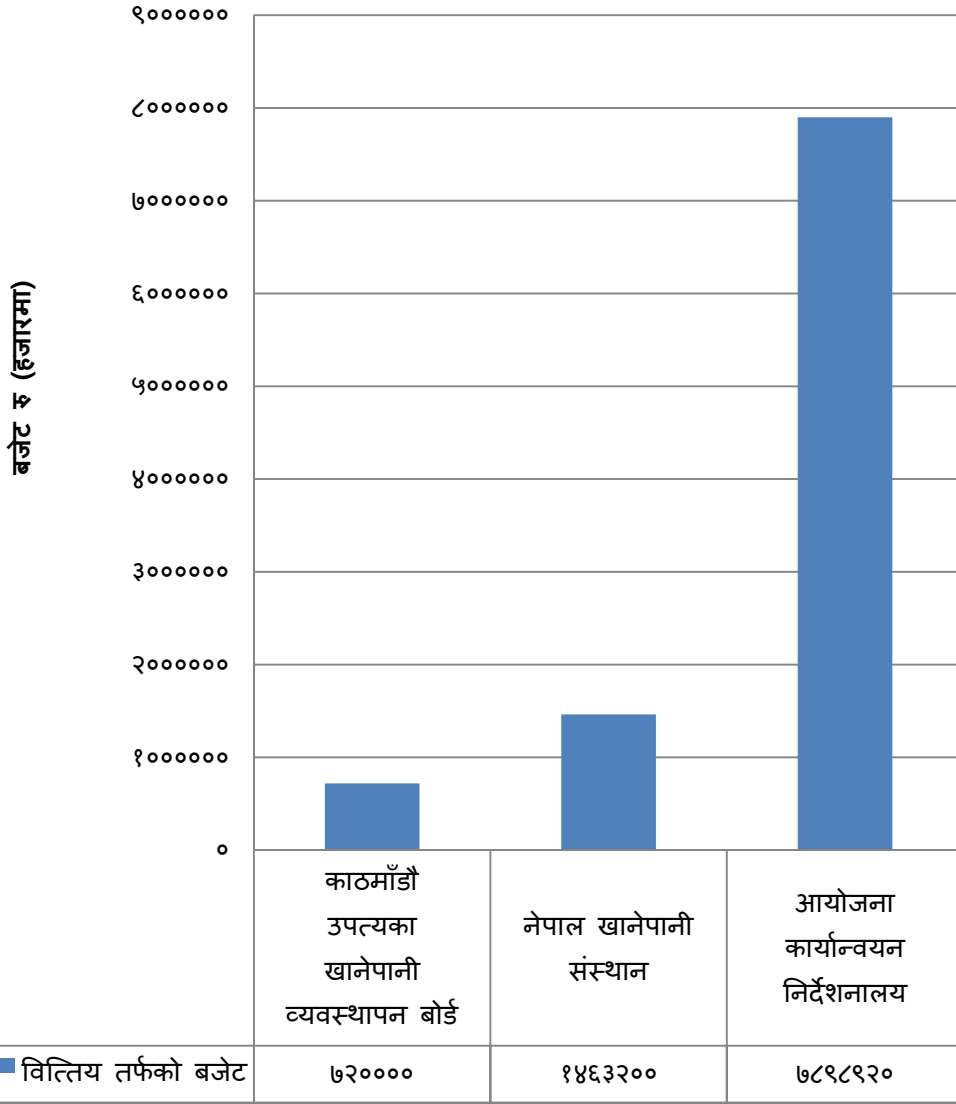

**खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको निकायगत दोस्रो चौमासिक बजेट र खर्च (रु हजारमा) तालिका**

निकाय	वार्षिक वजेट	दोस्रो चौमासिक			अष्टमासिक			वार्षिक खर्च प्रतिशत	कैफियत
		दोस्रो चौमासिक वजेट	दोस्रो चौमासिक खर्च	चौमासिक खर्च प्रतिशत	अष्टमासिक चौमासिक वजेट	अष्टमासिक चौमासिक खर्च	अष्टमासिक खर्च प्रतिशत		
खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय	२७८४१९	२६६०५	१५३९३	५७.८६	५६४.०३	२८२.६२	५०.११	१०.१५	२० करोड रुपिया भौतिक पुर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयमा दिने
श्री खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	१४००२९२३	४९७८६३५	२८०१२२६	५६.२६	८१३९४.८९	३७९६५.३१	४६.६४	२७.११	
श्री मेलम्ची खानेपानी विकास समिति	५९८४९२९	२००७१७८	१३१३३६५	६५.४३	४०१७३.५६	२३६०१.१८	५८.७५	३९.४३	
श्री आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय	७८९८९२०	२५४४२८५	९६३४१३	३७.८७	३७०६४.३९	१८०७५.२०	४८.७७	२२.८८	
श्री काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	७२००००	८८०००	२२९२३	४०.८९	१४४०.००	७२९.२३	५०.६४	१०.१३	
श्री नेपाल खानेपानी संस्थान	१४६३२००	११६३३६०	२९४७५०	२५.३३	१५३२६.२०	२९४७.५०	१९.२३	२०.१४	
श्री ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति	१६४२४४६	१९७३२२	१२१०८७	६१.४	५८६२.८८	३९२०.०८	६६.८६	२३.८७	
श्री ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई सुधार आयोजना कम्पोनेन्ट २	१६५६६३	६१५३०	१३२९३	२१.६	१०४९.३६	१९७.४९	१८.८२	११.९२	DSOS Consultancy को नियुक्ति (प्रकृत्यामा रहेको)
जम्मा	३२१५६५००								

## बजेट र खर्च तालिका

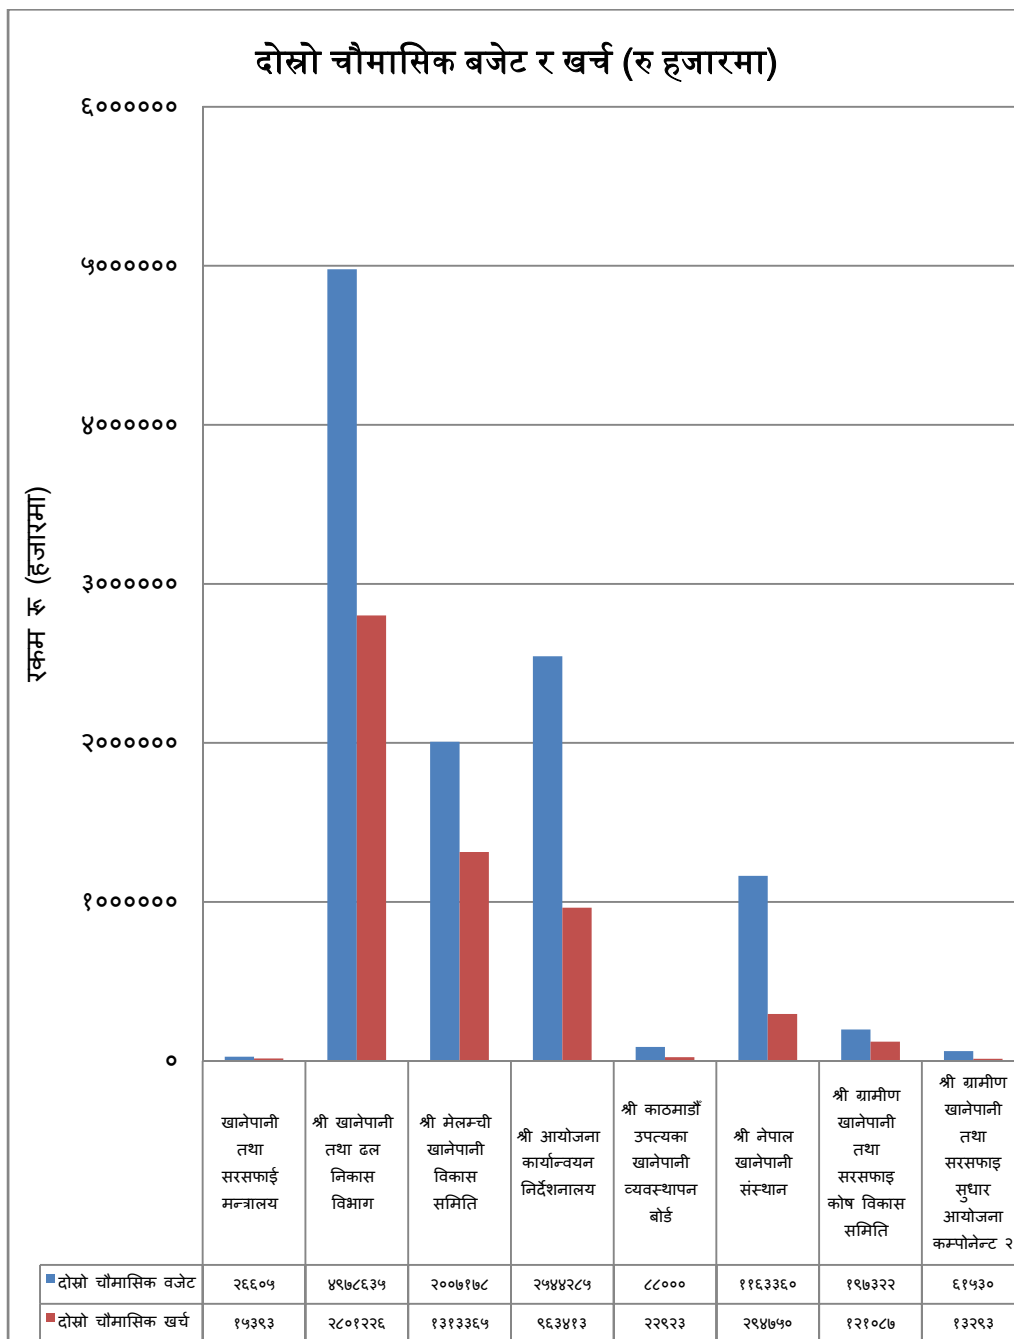

## दोस्रो चौमासिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति

सि.नं.	निकायहरु/कार्यालयहरु	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय लक्ष्य रु हजारमा	वित्तीय खर्च रु हजारमा	वित्तीय प्रगति %
१	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय	१००	१५.१४	२६६०५	१५३९३	५७.८६
२	श्री खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	१००	८०.२१	४९७८६३५	२८०१२२६	५६.२६
३	श्री मेलम्ची खानेपानी विकास समिति	१००	७४.७१	२००७१७८	१३१३३६५	६५.४३
४	श्री आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय	१००	७४.४१	२५४४२८५	९६३४१३	३७.८७
५	श्री काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	१००	७३.८८	८८०००	२२९२३	४०.८९
६	श्री नेपाल खानेपानी संस्थान	१००	६७.१०	११६३३६०	२९४७५०	२५.३३
७	श्री ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति	१००	६३.००	१९७३२२	१२१०८७	६१.४०
८	श्री ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना-कम्पोनेन्ट २	१००	६१.८०	६१५३०	१३२९३	२१.६०


## मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक संक्षिप्त प्रगति विवरण:

(रकम रु हजारमा)

मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक बजेट:	११००५३८५
मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक खर्च:	५३१४४२८
मन्त्रालयको अष्टमासिक अवधि सम्मको बजेट:	१८८१२१०४
मन्त्रालयको अष्टमासिक अवधि सम्मको खर्च:	९०१४४०७
मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक अवधिको भौतिक प्रगति:	६९.९४%
	वित्तीय प्रगति: ४८.२९%
मन्त्रालयको अष्टमासिक अवधिको भौतिक प्रगति:	६६.०८%
	वित्तीय प्रगति: ४७.०९%

## निकायगत दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

- भौतिक प्रगति
- वित्तीय प्रगति

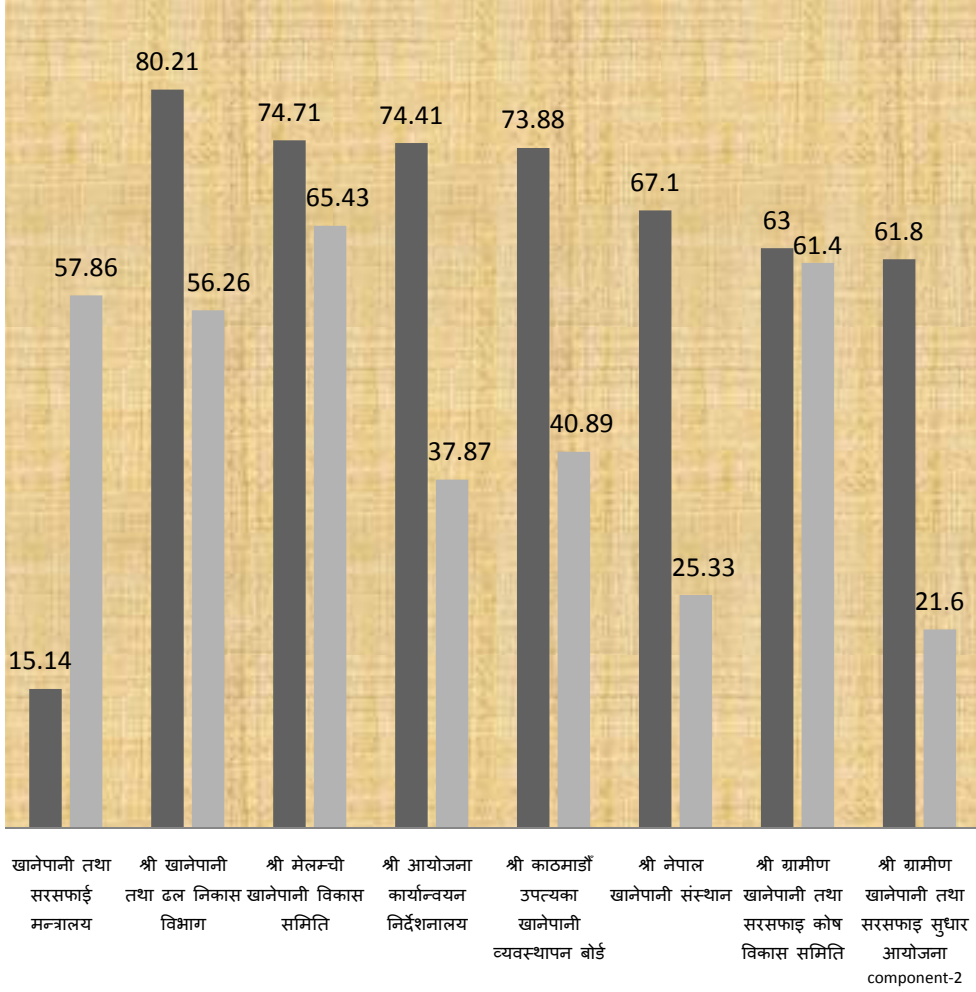

**मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको संक्षिप्त जानकारी तालिका**  
**आ.ब. २०७३।७४**

१	२	आयोजनाको नाम	४	आयोजनाको कूल लागत	दातृ संस्था	शुरु मिति	सम्पन्न मिति	आयोजना शुरु देखि अघिल्लो आ.ब. सम्मको प्रगति (आ.ब. २०७२/७३)		
				५	६	७	८	खर्च रु	वित्तिय प्रगति %	भौतिक प्रगति %
१	३१३११६	वातावरणिय सरसफाई आयोजना	p1	सालवसाली	नेपाल सरकार UNICEF/WHO/UN-Habitat	२०५७/५८	सालवसाली	सालवसाली		
२	३१३१०१	राष्ट्रिय सुचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन आयोजना	p3	सालवसाली	नेपाल सरकार/ UNICEF	२०५९/६०	सालवसाली	सालवसाली		
३	३१३१०२	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रम	p1	सालवसाली	नेपाल सरकार/ UNICEF	सालवसाली		सालवसाली		
४	३१३१०३	डिप टयुवेल आयोजना (मर्मत सुधार)	p1	सालवसाली	नेपाल सरकार	सालवसाली		सालवसाली		
५	३१३१०४	जनसाधन विकास कार्यक्रम	p2	सालवसाली	नेपाल सरकार /UNICEF	सालवसाली		सालवसाली		
६	३१३१०६	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	p1	सालवसाली	नेपाल सरकार/ UNICEF	२०५३/५४	सालवसाली	सालवसाली		
७	३१३१०९	जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनिकरण तथा उपयुक्त प्रविधि प्रवर्द्धन आयोजना	p1	सालवसाली	नेपाल सरकार	२०६५/६६	सालवसाली	सालवसाली		
८	३१३११०	ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम	p1	सालवसाली	नेपाल सरकार	२०५७/५८	सालवसाली	सालवसाली		
९	३१३१०७	दोश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	p1	७१.७ मिलियन अमेरिकी डलर	नेपाल सरकार/ ADB	२०६६/६७	२०७२/७३	१४९३२०५८	७५.१८	८४.६०
१०	३१३१११	खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कार्यक्रम	p1	सालवसाली	नेपाल सरकार	२०७०/७१	सालवसाली	सालवसाली		
११	३१३११२	सुक्खाक्षेत्र (रामेछाप बृहत,पकरवास,तिमाल र यासोक) खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	p1	सालवसाली	नेपाल सरकार	२०७०/०७१	सालवसाली	सालवसाली		
१२	३१३११३	तराइ मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम	p1	सालवसाली	नेपाल सरकार	सालवसाली		सालवसाली		

चौमासिक तथा अष्टमासिक प्रतिवेदन /१४

१	२	आयोजनाको नाम	४	आयोजनाको कूल लागत	दातृ संस्था	शुरु मिति	सम्पन्न मिति	आयोजना शुरु देखि अघिल्लो आ.व. सम्मको प्रगति (आ.व. २०७२/७३)		
				५	६	७	८	९	१०	११
								खर्च रु	वित्तिय प्रगति %	भौतिक प्रगति %
१३	३१३१०८	तेश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	p1	१०९ मिलियन अमेरिकी डलर	नेपाल सरकार/ ADB	२०७१/०७२	२०७७/०७८	१०१३९३३	९.६९	२२.५०
१४	३१३८०१	ग्रामीण खानेपानी आयोजना	p1	**	HELVETAS	२०७१/७२	२०७३/७४	**वार्षिक रुपमा प्रप्त हुने अनुदान**		
१५	३१३८०२	खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	p1	सालवसाली	नेपाल सरकार	सालवसाली		सालवसाली		
१६	३१३८०३	उच्च /मध्यमस्तरिय ठूला खानेपानी आयोजनाहरू	p1	सालवसाली	नेपाल सरकार	२०७१/०७२	सालवसाली	सालवसाली		
१७	३१३०१२	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	p1	सालवसाली	नेपाल सरकार	सालवसाली		सालवसाली		
१८	५०११२८	काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	p1	सालवसाली	नेपाल सरकार	सालवसाली		सालवसाली		
१९	५०११७७	ढल प्रशोधन केन्द्र	p1	सालवसाली	नेपाल सरकार	२०७७/७८	सालवसाली	सालवसाली		
२०	३१३११४	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	p1	२८७.४ मिलियन अमेरिकी डलर	नेपाल सरकार/ ADB/ JICA/ NDF	२०५५/५६	२०७४/७५	१८१४२४००	७७.७९	७९.३८
२१	३१३११५	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	p1	९० मिलियन अमेरिकी डलर	नेपाल सरकार/ IDA	सन् २००१	-	१४.८४ मिलिएन अमेरिकी डलर	१६.४९	२४.८२
२२	५०११३५	काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना निर्देशनालय	p3	३,४६९,७६०,०००.००	नेपाल सरकार/ ADB	६ अप्रिल २००८	डिसेम्बर ३१, २०१६	३,२३६,५९३,३४३.५९	९३.४९	९८.५०
२३	५०११४५(क)	काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	p1	९,७५०,०००,०००.००	नेपाल सरकार/ ADB	१० नोभेम्बर २०११	जुन ३०, २०१७	५,९८५,९३९,४४६.००	६१.३९	५६
	५०११४५(ख)	काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना		१३,२९०,६००,०००.००	नेपाल सरकार/ ADB	७ डिसेम्बर २०१५	डिसेम्बर ३१, २०२०	३८२,०५९,२६५.८२	२.८९	११.१२
२४	५०११६७	काठमाण्डौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	p1	१२,०२९,९५२,०००.००	नेपाल सरकार/ ADB	३ जुलाई २०१३	डिसेम्बर ३१, २०१८	५९८,०६०,९९७.०४	४.३९	१५.९०
२५	५०११२६	खानेपानी उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम	p2	सालवसाली	नेपाल सरकार	सालवसाली		सालवसाली		
२६	५०११२७	खानेपानी तथा ढल निकास कार्यक्रम	p2	सालवसाली	नेपाल सरकार	सालवसाली		सालवसाली		
२७	३१३०११	खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय	p1	सालवसाली	नेपाल सरकार	सालवसाली		सालवसाली		

चौमासिक तथा अष्टमासिक प्रतिवेदन/१५



**खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको आ.व. २०७३।७४ को दोस्रो चौमासिकको  
उल्लेखनीय उपलब्धीहरु**

क्र.सं.	निकाय	कार्यक्रम	उपलब्धी
१	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	वातावरणीय सरसफाई आयोजना	यस अवधिमा मा १० नगरपालिका, १५९ गा. वि. स. खुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा भएको।(हाल सम्म २४३५ गा. वि. स., १३२ नपा तथा ३८ जिल्लाहरु खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको)
		दोस्रो साना शहरी खा. पा. आ.	यस आ व मा ४ बटा सहित हाल सम्म १७ वटा आयोजनाहरु सम्पन्न भई ७६७७३ जनसंख्या लाभान्वित भएको।
		खानेपानी तथा सरसफाई सह- लगानी का.	४ वटा आयोजनाहरु बोलपत्र आव्हान भएको तथा ८ आयोजनाहरुको DPR Final भई बोलपत्र आव्हान हुने क्रममा रहेको, ८ वटा आयोजनाहरुको DPR तयार गर्न consultant हरु सँग सम्झौता भएको, थप २ वटा आयोजनाहरुको DPR तयार गर्न RFP Issue गरी Consultant छनौट कार्य भै रहेको । ८ वटा नयाँ आयोजनाहरुको Feasibility Study का लागी परामर्शदाता छनौट भएको । क्रमागत आयोजनाहरुमा निर्माण कार्य सुचारु रहेको।
		सुक्खा क्षेत्र खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	
		तराइ मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम	सर्भेक्षण कार्यक्रमको consultant सँग सम्झौता सम्पन्न भइ Detailed सर्भेक्षण को लागि फिल्डमा खटिइ Design Report तयारी चरणमा रहेको। निर्माण कार्य गराउन ठेक्का पट्टा प्रक्रिया अघि बढिसकेको।
		तेस्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	७ वटा आयोजनाहरुलाइ निर्माणको दोश्रो चरणमा लैजान निर्माण कार्य सूचारु रूपमा भइरहेको ।सल्यान खानेपानी आयोजना सम्पन्न ८४७६ जनसंख्या लाभान्वित

क्र.सं.	निकाय	कार्यक्रम	उपलब्धी
२	मेलम्ची खानेपानी विकास समिति	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	<p>-हेडवर्क्स निर्माण कार्यको ६४०००घ.मी. ओपन कट भएको र RL १४४१ मी. सम्ममा रक सपोर्टको काम भएको । Headworks Access road मा ३५ घ.मी. Gabion निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको । RL १४४१ मी. मा Access Road को कार्य सम्पन्न भएको ।</p> <p>- चालु आ.ब. मा ५२५२ मीटर समेत गरी जम्मा २३१८४ मी. सुरङ्ग निर्माण भएको ।</p> <p>- चालु आ.ब.को हालसम्ममा ३२८४.१२ घ.मी. समेत समग्रमा २१२२२.१२ घ.मी. कक्रिट ढलान कार्य सम्पन्न भएको छ । (हालसम्म ९९% कार्य सम्पन्न)</p>
३	आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सूधार आयोजना	<p>वितरण संजाल प्रणालीको ३ प्याकेजको कार्य शुरु भई जम्मा ६७० कि.मि. मध्ये ५५५ कि.मि. पाइप जडान भइसकेको थोक वितरण प्रणाली विस्तार कार्य अन्तर्गत विभिन्न तिनवटा प्याकेजको निर्माण कार्य सम्भौता भई ४०० देखि १४०० मि.मि. व्यासको पाइप ५१ कि.मि. मध्ये ३२ कि.मि. विछ्याउने तथा ६ स्थानमा रिजरभ्वायर ट्यांक निर्माण कार्य संचालन भई करिव ८१ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको ।</p>
		काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सूधार आयोजना (Additional Financing)	<p>थोक वितरण प्रणाली विस्तार कार्यको १८ कि.मि. मध्य ९ कि.मि. सम्पन्न भएको र विभिन्न ६ स्थानमा रिजरभ्वायर ट्याङ्क निर्माण कार्य गर्ने मध्ये भक्तपुरको टिंगनीमा र काठमाण्डौको किर्तिपुर गरी करिव २७.५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको र कटुन्जेमा निर्माण कार्य शुरु हुन गइ रहेको ।</p> <p>वितरण संजाल प्रणालीको कार्य गर्दा भत्कीएको सडकको पुनरस्थापन गर्नको गरिएको वोलपत्र सम्झौता भइ निर्माण कार्य शुरु भएको ।</p>

क्र.सं.	निकाय	कार्यक्रम	उपलब्धी
		काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	<p>गुह्येश्वरीको ढल प्रशोधन केन्द्रको बोलपत्र सम्झौता भै निर्माण पूर्व गरिने सर्भेक्षण भइ डिजाइन कार्य भइरहेको ।</p> <p>सल्लाघारी, कोडकु र धोबीघाट ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्यको बोलपत्र सम्झौता गर्नको लागि Letter या Acceptance दिएको हुनुमन्तेको किनारमा इन्टरसेप्टर निर्माणको लागि ठेकेदार संग सम्झौता भइ निर्माण कार्य शुरु भएको ।</p> <p>मनोहरा नदीको किनारमा इन्टरसेप्टर निर्माणको लागि ठेकेदार संग सम्झौता भइ निर्माण कार्य शुरु गर्ने तयारी भएको ।</p>
४	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	<p>यस अवधिमा २८ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरू सम्पन्न भई २५४७८ ग्रामीण जनता सुरक्षित खानेपानीबाट लाभान्वित तथा सरसफाइमा पहुच भएका छन् । यस आर्थिक वर्षमा ४४ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरू सम्पन्न भई ४४६९५ ग्रामीण जनता सुरक्षित खानेपानीबाट लाभान्वित तथा सरसफाइमा पहुच भएका छन् ।</p>

## कार्यक्रम संचालनमा देखिएका समस्याहरू तथा समाधानका उपायहरू

सि.नं.	निकायहरू/ कार्यालयहरू	समस्या	समाधानको उपाय
१	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय	कार्यस्थलको अभाव	मन्त्रालयको सभाकक्ष बनाउन राजनैतिक र प्रशासनिक पहल हुनुपर्ने ।
२	श्री खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषित भएका क्षेत्रहरूमा चर्पी प्रयोगलाई निरन्तरता नदिइएको पाइएको । तराई तथा पहाडका केहि जिल्लाहरूमा सरसफाई कार्यक्रमले गति लिन नसकेको	सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रमा घरायसी चर्पी निर्माणमा सरकारको अनुदान दिने निति नरहेको बारे प्रभावकारी प्रचार गर्नुपर्ने । सन् २०१७ सम्म सबैलाई सरसफाई पुर्याउने (ODF) राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त श्रोत विनियोजन गर्नु पर्ने ।
		बिनियोजित बजेटको तुलनामा बर्षेनी धेरै सङ्ख्यामा पुनर्सथापन गर्न माग आउने गरेको ।	डिभिजन सव डिभिजन कार्यालयहरूमा मर्मत प्राथमिकता क्रम अध्यावधिक बनाइ मात्र मर्मत संभार मा बजेट विनियोजन गरी कार्य गर्न पहल भइरहेको ।
		प्राविधिक जनशक्तिको अभाव	इन्जिनियरहरू काजमा खटाइदिन निवेदन गरेको। करार सेवा लिने प्रक्रियामा।
		पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माणको ज्ञान क्षमतामा कमी भइ आयोजना कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको । सन् २०१७ सम्ममा २७ प्रतिशत जनतालाई मध्यम तथा उच्च स्तरिय खानेपानी सेवा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न भनिएकोमा हाल सम्म १५ % लाई मात्र उपलब्ध भएको । बजेट र जनशक्तिको अभाव ।	नुगमन गरी सुझाव दिइएको, अभीमुखीकरण, प्रशोधन प्रणाली सम्बन्धी तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरीएको । खानेपानी सुरक्षा योजना (WSP) प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा तिनवटा स्किमहरूमा सञ्चालन गरिएको ।
३	श्री मेलम्ची खानेपानी विकास समिति	सिन्धु ग्याल्युम खण्डको विभिन्न चेजेजहरूमा कमजोर चट्टान भेटिएको । - निर्माण व्यवसायीले श्रोत परिचालन गर्न नसकेको । - उपकरणहरूको Breakdown भएको ।	निर्माण सामाग्रीको प्रयास भण्डारण गर्न - निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको । - थप उपकरणको व्यवस्था गर्न निर्देशन गरिएको । - कमजोर चट्टान रहेको स्थानमा सुरुङ्ग खन्ने कार्यका लागि बैकल्पिक उपायहरूको अध्ययनका लागि निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदातालाई निर्देशन गरिएको ।
४	श्री आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय	पाईप लाईन विछ्याउने कार्यको लागि सडक खन्नु पर्दा धुलो व्यवस्थापनमा समस्या अव्यवस्थित वस्तीका कारणले सर्वेक्षणको क्रममा Underground	सबै Stakeholder सम्मिलित बैठक गरि समस्या समाधानको प्रयास गरिएको । धुलो व्यवस्थापनका लागि पानी छर्केने कार्य यथा संभव छिटो Prime Coat गरी

सि.नं.	निकायहरू/ कार्यालयहरू	समस्या	समाधानको उपाय
		Utility को अवस्था एकिन नभएकोले पाईप विछ्याउने कार्यको लक्ष्य अनुसार प्रगती हुन नसकेको साथै Utility Relocation गर्न थप समय तथा लागत लाग्ने गरेको ।	Asphalt Concrete गर्ने कार्य गरेको । साथै Air Pollution Monitoring गर्ने कार्य करिव १४ स्थानमा संचालन गर्ने कार्य शुरु गरिएको । साईटमा काम गर्ने समूह तथा मेसिन तथा अन्य साधन बढाई रातको समयमा पनि काम गराइ रहेको ।
५	श्री काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	कानूनी जटिलताले गर्दा जग्गा सुरक्षा तथा जग्गा अधिग्रहण कार्यमा ढिलाई ।	विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी समाधानका लागि प्रयास गरिएको ।
६	श्री नेपाल खानेपानी संस्थान	स्थानीय स्तरका मागहरू जस्तै ड्रेन निर्माण, सडक निर्माण, मुआब्जा, डिप वेल निर्माणको लागि समय भित्र सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध नहुनु । विद्युत लाईन जडान हुनुपर्ने खानेपानीको आपूर्ति व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता मागहरू उठ्नु ।	नगरपालिकामा सर्वपक्षिय बैठक गरी समस्या तथा त्यसका उपायका बारेमा छलफल गरियो । समस्या समाधानको लागि संयुक्त प्रयास गर्न सहमति भएको ।
७	श्री ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति	संघीय संरचना बमोजिम कार्यक्षेत्र विस्तार स्थानिय निकायको ) (पुर्नसंरचना यस आआयोजना स्थानीय ६५०व मा . निकायबाट छनोट तथा प्राथमिकीकरण गर्न अन्याूलता	

आर्थिक वर्ष ०७३।७४ मा फछ्यौट गर्नपर्ने बेरुजु विवरण

निकायगत बेरुजु

रु हजारमा

क्र. सं.	निकाय	जम्मा लगत	०७३ चैत्र मसान्त सम्ममा फछ्यौट भएको अंक	फछ्यौट प्रतिशत	सम्परीक्षणको लागी महालेखा परिक्षकको का मा लेखीएको अंक	मोविलाईजेसन पेशकी	पेशकी बाहेक बाँकी लगत
१	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय	०	०	०।००			०
२	खानेपानी तथा ढल विकास विभाग	९८७३३३	२४२००५	२४।५१	४९१५०	०	७४५३२८
३	मेलम्ची खानेपानी विकास समिति	२९१६२७५	६६४२७७	२२।७८	७३२०७१	२०५३२३१	१९८७६७
४	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड	५४४९	०	०।००	०।००	०	५४४९
५	आयोजना कार्यन्यवन निर्देशनालय	१५७३७६८	६१३४६	३।९०	०।००	१४६२७५८	४९६६४
<b>जम्मा</b>		<b>५४८२८२५</b>	<b>९६७६२८</b>	<b>१७।६५</b>	<b>७८१२२१</b>	<b>३५१५९८९</b>	<b>९९९२०८</b>
<b>समितीगत</b>							०
१	ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई विकास कोष	२६४४८२	२३९५०४	९०।५६			२६४४८२
२	खानेपानी महशुल निर्धारण आयोग	२५४५४	०	०।००			२५४५४
<b>जम्मा</b>		<b>२८९९३६</b>	<b>२३९५०४</b>	<b>८२।६१</b>		<b>७०३१९७८</b>	<b>२२८८३५२</b>
<b>कुल जम्मा</b>		<b>५७७२७६१</b>	<b>१२०७१३२</b>	<b>२०।९१</b>		<b>१०५४७९६७</b>	<b>३२८७५६०</b>



## मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूको सारांश तालिका (Summary Sheet)

सि. नं.	बजेट उ. शी नं	कार्यक्रम आयोजनाको नाम	प्राथमिकता क्रम	आयोजनाको कूल लागत	दातृ संस्था	शुरु मिति	सम्पन्न मिति	आयोजना शुरु देखि अघिल्लो आ. व. सम्मको प्रगति (आ. व. २०७२/७३)			वार्षिक बजेट	नेपाल सरकार	अनुदान	ऋण	प्रथम चौमासिक						दोस्रो चौमासिक					यस आ व को हालसम्मको (अष्टमासिक)					कैफियत		
								खर्च रु	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %					भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	भौतिक प्रगति	बजेट	खर्च	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	भौतिक प्रगति	बजेट	खर्च		वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
																																	१
१	३१३११६	वातावरणिय सरसफाई आयोजना	p1	सालवसाली	नेपाल सरकार UNICEF/WHO/JUN-Habitat	२०५७/५८	सालवसाली								२२,२१०	६.१८	४.३३	१,५००	७०.००	६.७५	३२.००	३२.००	१००.००	११४,९४२	११४,९४२	१००.००	४६.४९	४४.१६	९५.००	१६६९६२	१२५२४५	७५.०१	यस अवधिमा १० न.पा. १५९ गा.वि.स. खुला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा भएको (हाल सम्म २४३५ गा.वि.स, १३२ नपा तथा ३८ जिल्लाहरु)
२	३१३१०१	राष्ट्रिय सुचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन आयोजना	p3	सालवसाली	नेपाल सरकार/UNICEF	२०५९/६०	सालवसाली								१,२५७	२१.३९	११.८६	३९	५५.४५	३.१०	१९.६२	१३.९३	७०.९८	२,५८२	१,४९१.०	५७.७५	२९.१७	१९.१८	६५.७६	३८३९	१५३१.०	३९.८८	खानेपानी तथा सरसफाइको तथ्याडक अध्यावधिक गर्न काम भइरहेको ।
३	३१३१०२	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्संयोजन कार्यक्रम	p1	सालवसाली	नेपाल सरकार/UNICEF		सालवसाली								०.००	०.००	०.००	०	०.०	०.००	३७.८६	२१.४४	५६.६३	२८८,७४०	९४,३८५	३२.७	२४.८३	१८.२८	७३.५९	३२०,३१६	९४,३८५	२९.५	मर्मत गर्नुपर्ने आयोजनाहरूको लगत ईष्टिमेट तयार भइ मर्मत कार्य अगाडी बढेको ।
४	३१३१०३	डिप ट्यूबेल आयोजना (मर्मत सुधार)	p1	सालवसाली	नेपाल सरकार		सालवसाली								२८,७१४	३२.११	२४.७२	८,३८६	७७.००	२९.२१	२९.४५	२४.७१	८३.९०	२६,३४०	६,७५३	२५.६४	६१.५७	५१.४३	८३.५३	५९०६८	१५४६०	२८.०७	यस आ.व.मा चार वटा आयोजना सम्पन्न
५	३१३१०४	जनसाधन विकास कार्यक्रम	p2	सालवसाली	नेपाल सरकार/UNICEF		सालवसाली								४१,६४३	४१,६४३	०	४१,६४३	८२.२०	३०.३३	३९.८७	३२.१०	८०.५३	१६,६०१	५,३५१	३२.२३	४९.५९	४१.०५	८२.७८	२०६४९	६५९१	३१.९२	यस अवधिमा ४१९जनालाई तालिम प्रदान गरिएको ।
६	३१३१०६	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	p1	सालवसाली	नेपाल सरकार/UNICEF	२०५३/५४	सालवसाली								७१,७३०	१७.६९	११.५२	१३,९०४	६५.१३	१९.३८	४२.२७	३२.४६	७६.७९	१७१,४०४	६४,९३०	३७.८८	५९.९५	४३.४८	७२.५३	२४३१३४	९६७५८	३९.८०	निर्माण कार्यको लागि ठेक्का पट्टा / उपभोक्ता संस्थाहरूसङ्ग सम्झौता भएको र केहि आयोजनाहरूमासम्झौता प्रक्यामा रहेको । २ गोटा खानेपानी गुणस्तर सुधार योजना सम्पन्न भइ ११६८० जनसंख्या लाभान्वित भएको ।
७	३१३१०९	जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनिकरण तथा उपयुक्त प्रविधि प्रवर्द्धन आयोजना	p1	सालवसाली	नेपाल सरकार	२०६५/६६	सालवसाली								११,०५९	१०.९३	९.३२	७,०९८	८५.३१	६.४८	३८.८८	३३.२४	८५.५०	३९,३४२	१७,६१३	४४.७७	४९.८०	४२.७९	८५.९१	५०३९३	२४७११	४९.०४	जिल्ला स्तरिय आयोजनाहरूको उपभोक्ता समिति सङ्ग सम्झौता भइ निर्माणको कामहरू भइरहेको, १५ वटा स्कुलहरूमा वर्षातको पानी संकलन नमुना आयोजनाहरू सम्पन्न, विभागको क्रियाकलापहरूकमा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको RFP माग भएको
८	३१३११०	ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम	p1	सालवसाली	नेपाल सरकार	२०५७/५८	सालवसाली								३७,२९६	१८.४५	१०.०५	२,३७८	५४.४७	६.३८	४१.७९	२८.७४	६८.७८	८४,४७८	४,२१७	४.९९	६०.२४	३७.४१	६२.१०	१२१७७४	२३८००	१९.५४	क्रमागत आयोजनाहरूमा निर्माण कार्य सुचारु रहेको, नया आयोजनाहरूको डिपीआर तयार हुँदै । EOI चरण(सम्भावित ७ वटा प्रादेशिक सदरमुकामहरूको एकीकृत खानेपानी र ढल व्यवस्थापनको विस्तृत अध्ययन १३ वटा ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजनाहरूको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन १० स्थानमा एकीकृत खानेपानी र ढल व्यवस्थापनको सम्भाव्यता अध्ययन)
९	३१३१०७	दोश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	p1	७१.७ मिलियन अमेरिकी डलर	नेपाल सरकार/ADB	२०६६/६७	२०७२/७३	१४९३२०५८	७५.१८	८४.६०	३६०,४५५	१२२,४३५	२३८,०२०		१४९,४९९	४१.४८	२८.९१	९८,१४५	६९.७१	६५.६५	३३.९०	३१.००	९१.४६	१२२,१९४	९८,१४५	८०.३२	७५.३८	५९.६२	७९.१०	२७१६९३	१४७२८७	५४.२१	यस आ.व. मा ४ वटा सहीत हाल सम्म १७ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न भइ ७६७७३ जनसंख्या लाभान्वित भएको ।
१०	३१३१११	खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कार्यक्रम	p1	सालवसाली	नेपाल सरकार	२०७०/७१	सालवसाली								१३८,१८३	१७.०१	१४.९७	३७,४९४	८८.०४	२७.१३	३५.९६	२९.३५	८१.६२	२९२,१३५	१५४,१६२	५२.७७	५३.१६	४३.३५	८१.५४	४३१९१८	२२५७४१	५२.२६	४ वटा आयोजनाहरू बोलपत्र आव्हान भएको तथा ८ आयोजनाहरूको DPR Final भई बोलपत्र आव्हान हुने क्रममा रहेको, ८ वटा आयोजनाहरूको DPR तयार गर्न consultant हरू सँग सम्झौता भएको, यप २ वटा आयोजनाहरूको DPR तयार गर्न RFP Issue गरी Consultant छनौट कार्य भै रहेको । ८ वटा नयाँ आयोजनाहरूको Feasibility Study का लागी परामर्शदाता छनौट भएको । क्रमागत आयोजनाहरूमा निर्माण कार्य





सि. नं.	बजेट उ. शी नं.	कार्यक्रम आयोजनाको नाम	प्राथमिकता क्रम	आयोजनाको कूल लागत	दातृ संस्था	शुरु मिति	सम्पन्न मिति	आयोजना शुरु देखि अघिल्लो आ. व. सम्मको प्रगति (आ. व. २०७२/७३)			वार्षिक बजेट	नेपाल सरकार	अनुदान	ऋण	प्रथम चौमासिक						दोस्रो चौमासिक						यस आ व को हालसम्मको (अष्टमासिक)						कैफियत			
								खर्च रु	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %					भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	भौतिक प्रगति	बजेट	खर्च	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	भौतिक प्रगति	बजेट	खर्च	वित्तीय प्रगति प्रतिशत					
																																१		२	३	४
२१	३१३११५	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम	p1	९० मिलियन अमेरिकी डलर	नेपाल सरकार/ IDA	सन् २००१	-	१४.८४	१६.४९	२४.८२	१,८०८,१०९	२०१,२६९	५००,८६९	१,१०५,९७९	३८८९६६	२.५८	१.८०	२७०,९२१	६९.७७	६९.६५	२.५८	१.८०	६३.००	१९७,३२२	१२१०८७	६१.४०	५.१६	२.०६	४०.००	५८६२८०.००	३९,२०१६	६६.८६				
२२	५०११३५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना निर्देशनालय	p3	३,४६१,७६०,०००.००	नेपाल सरकार/ ADB	३०-Sep-०८	३१-Dec-१६	३,२३६,५१३,३४३.५९	९३.४९	९८.५०	३२०,०००		३२०,०००	१,५९९	१२५३००	०.७९	०.६५	०	८१.८६	०.००	०.९६	०.७५	७८.५६	१५२,८००	४६,२७७	३०.२९	१.७५	१.३९	७९.२५	२७८१००	४६,२७७	१६.६४				
२३	५०११४५ (क)	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	p1	९,७५०,०००.००	नेपाल सरकार/ ADB	७-Feb-१२	३०-Jun-१७	५,९८५,४६०.००	६१.३९	५६.००	२,०५४,०५०		४,५३१,०१४	४२२६७१.००	६.५९	६.५९	४२२,७७१	१००.००	१००.००	३२.००	३०.९७	९६.७८	६५९,८६५	४६६,५७६	७०.७१	६४.००	६१.९४	९६.७८	१०८२५३६	८८,३४७	८२.१५	वार्षिक लक्ष्यको भारतमाइ १०० मानेर गर्दा				
	५०११४५ (ख)	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना		१३,२१०,६००,०००.००	नेपाल सरकार/ ADB	११-Feb-१६	३१-Dec-२०	३,८०५,१६८,५८२.५८	२८.९९	११.१२	२,४७६,९६४		४,५३१,०१४	४९८३३७.००	४.२६	३.२०	२९७,८३६	७५.१२	५९.७७	२८.८४	२१.९७	७६.२०	७१.५०	७१५,६५३	३५४,२९९	४९.५०	४९.४५	३७.६८	७६.२०	१२१३९९०	६९,०५९.८	५३.७१				
२४	५०११६७	काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	p1	१२,०२९,९२०,०००.००	नेपाल सरकार/ ADB	८-Oct-१३	३०-Jun-१९	५,१८,०६०,१७०.००	४.३१	१५.९०	३,०४७,९०६		३,०४७,९०६	१,१५,८४६	१.०८	१.०८	१२३,५००	१००.००	१०६.६१	३३.३३	१९.३६	५८.००	१,०१,५९६	१६,३४१	९.००	६६.६६	२०.१८	३०.२७	२०३९१३४	२९९८४१	१०.१८					
२५	५०११२६	खानेपानी उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम	p2	सालवसाली	नेपाल सरकार	सालवसाली	सालवसाली	सालवसाली			१,३२२,७००		१,३२२,७००	१,३२२,७००	१.००	१.००	०	१००.००	१००.००	८०	४३	५४	१०५०९६०	१५७६४४	१५.००	९०	७१	७८.८९	११८३२३०	१५७६४४	१३.३२					
२६	५०११२७	खानेपानी तथा ढल निकास कार्यक्रम	p2	सालवसाली	नेपाल सरकार	सालवसाली	सालवसाली	सालवसाली			१,४०,५००		१,४०,५००	१,४०,५००	१.००	१.००	०	१००.००	१००.००	८०	४४	५५	११२४००	४०४६४	३६.००	९०	७०	७७.७८	१२६४५०	४०४६४	३२.					
२७	३१३०११	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय	p1	सालवसाली	नेपाल सरकार	सालवसाली	सालवसाली	सालवसाली			२७८,४१९		२७८,४१९	२७८,४१९	३८.००	१६.४१	१२,८६९	४३.१८	४३.१९	४५.५३	६.८९	१५.१४	२६,६०५	१५,३९३	५७.८६	९२.१४	५.५१	५.९८	४३३००	२८,२६२	६८.४३	२० करोड भौतिक मन्त्रालयलाई भेलम्चीको पईप गाइदा खानिएको सडक मर्मतका लागि छुटाइएको				
							जम्मा							३२१५६५०																				११००५३८५	५३१४४२८	

दोस्रो चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशत  
दोस्रो चौमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिशत  
हालसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत  
हालसम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिशत

६९.९४
४८.२९
६६.०८
४७.०९

## मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायगत सारांश तालिका (Summary Sheet)

आ व ७३।७४

सि.नं.	बजेट उ.शी नं	कार्यक्रम आयोजनाको नाम	वार्षिक बजेट	नेपाल सरकार	अनुदान	ऋण	प्रथम चौमासिक					दोस्रो चौमासिक					यस आ व को हालसम्मको (अष्टमासिक)					बेरुजु			कैफियत			
							बजेट	भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	भौतिक प्रगति	बजेट	खर्च	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	भौतिक प्रगति	बजेट	खर्च	वित्तीय प्रगति प्रतिशत		बेरुजु	फछ्यौट रकम	फछ्यौट प्रतिशत
१	*	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	१४,००२,९२३	८,३६१,४१३	३९३,२४३	५,२४८,२६७	३,१६०,८५४	२३.९३	१६.१२	९९५,३०५	६७.३४	३१.४९	३५.८२	२८.७३	८०.२१	४,९७८,६३५	२,८०१,२२६	५६.२६	५९.७५	४४.८५	७५.०६	८,१३९,४८९	३,७९६,५३१	४६.६४	९८७३३३	२४२००५	२४.५१	
२	*	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	७२०,०००	७२०,०००.००	०.००	०.००	५६,०००	२०.००	१९.२०	५०,०००.००	९६.०२	८९.२९	४०.००	२९.५५	७३.८८	८८,०००	२२,९२३	४०.८९	६०.००	४८.७६	८१.२६	१४४,०००	७२,९२३	५०.६४	५४४९	०	०.००	
३	३१३१ १४	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	५,९८४,९२९	२,०७०,३०२	०.००	३,९१४,६२७	२,०१०,१७८	११.२०	९.४७	१,०४६,७५३	८४.५४	५२.०७	११.२०	८.३७	७४.७१	२,००७,१७८	१,३१३,३६५	६५.४३	२२.४०	१७.८४	७९.६३	४,०१७,३५६	२,३६०,११८	५८.७५	२९१६२७५	६६४२७७	२२.७८	
४	३१३ १५	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	१,८०८,१०९	२०१,२६९	५००,८६९	१,१०५,९७१	३८८,९६६	२.५८	१.८७	२७०,९२१	७२.५६	६९.६५	२.५८	१.६३	६३.००	१९७,३२२	१२१,०८९	६१.४०	५.१६	३.५०	६७.७८	५८६,२८८	३९२,००८	६६.८६	२६४४८२	२३९५०४	९०.५६	
		ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजना कम्पोजिट २	ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम वाट वार्षिक बजेट रु १६५६६३ हजार छुट्टाइएको				४३,४०६	३३.००	१२.६७	६,४५६	३८.३९	१४.८७	३३.००	२०.३९	६१.८०	६१,५३०	१३,२९३	२१.६०	६६.००	३३.०६	५०.१०	१०४,९३६	१९,७४९	१८.८२	-	-	-	
५	ड	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना निर्देशनालय निर्देशनालय	७,८९८,९२०.००	१,७७४,४८४.००	०.००	६,१२४,४३६.००	१,१६२,१५४	३.१८	२.८८	८४४,१०७.००	९०.५६	७२.६३	२३.७८	१७.७०	७४.४१	२,५४४,२८५	९६३,४१३	३७.८७	२६.९६	२०.५८	७६.३२	३,७०६,४३९	१,८०७,५२०	४८.७७	१५७३७६८	६१३४६	३.९०	
६	ड	नेपाल खानेपानी संस्थान	१,४६३,२००.००	१,४६३,२००.००	०.००	०.००	३६९,२६०	१०.००	१०.००	०.००	१००.००	०.००	८०.००	५३.६८	६७.१०	१,१६३,३६०	१९८,१०८	५६.२६	९०.००	६३.६८	७०.७६	१,५३२,६२०	३,७९६,५३१	४६.६४	-	-	-	
७	३१३० ११	खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय	२७८,४१९	२७८,४१९	०.००	०.००	२९,७९८	३८.००	०.४०	१२,८६९	१.०५	४३.१९	४५.५३	६.८९	१५.१४	२६,६०५	१५,३९३	५७.८६	८३.५३	७.२९	८.७३	५६,४०३	२८,२६२	५०.११	०	०	०.००	
जम्मा			३२१५६५००	१४८६९०८७	८९४११२	१६३९३३०१	७२२०६१६			३२२६४११					११,०६६,९१५	९३०००९८					१८२८७५३१	१८२८७५३१		५७७२७६१	१२०७१३२	२०.९१		

दोस्रो चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशत

६९.९४

दोस्रो चौमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिशत

४८.२९

हालसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत

६६.०८

हालसम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिशत

४७.०९

## मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यक्रमहरूको संक्षिप्त चिनारी विवरण

### १. वातावरणीय सरसफाई आयोजना

१. बजेट उपशिर्षक : ३१३११६
२. उद्देश्य : खुला दिशा मुक्त गर्ने
३. लागू जिल्ला : ७५ वटै
४. शुरु देखि हाल सम्मको प्रगति : ३८ जिल्ला, १३२ न.पा. , २४३५ गा. वि. स. खुला दिशा मुक्त घोषणा भइसकेको।
५. कुल लागत  
श्रोत: नेपाल सरकार २८६२५५०००  
वैदेशिक : ७२९००००० UNICEF/ WHO/ UN- HABITAT  
कुल : ३५९१५५००० (सालवसाली) (आ.व. ७३/७४)
६. गत आ.व. सम्मको प्रगति: ३८ जिल्ला , ८९ न.पा. , २११० गा. वि.स. खुला दिशा मुक्त घोषणा भइसकेको। ८७% घरघुरिमा शौचालयको पहुँच पुगेको।
७. यस आ.वको दोस्रो चौमासिक प्रगति: वित्तिय: १००%  
भौतिक: १००%  
अष्टमासिक भौतिक प्रगति: ९५%  
वित्तिय प्रगति: ७५.०१%
८. आयोजना प्रमुख: प्रेम कृष्ण श्रेष्ठ (सि.डि.ई)  
खानेपानी तथा ढल निकास विभाग

### २. दोस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना

- ❖ बजेट उपशिर्षक : Grant 0157NEP(३१३१०७)
- ❖ उद्देश्य : ३ लाख ७० हजार ९९ जनसंख्यालाई गुणस्तरीय खानेपानी तथा आधारभुत सरसफाइको सुविधा पुऱ्याउने।
- ❖ लागू जिल्ला :
- ❖ पाँचथर/ मोरङ/भापा/सुनसरी/ बाग्लुङ/रुपन्देही/अर्घाखाँची/ दाङ/ दैलेख/ कैलाली/ कञ्चनपुर/ बैतडी/संखुवासभा/ चितवन/ नवलपरासी/पाल्पा/ तनहुँ/
- ❖ शुरुदेखि हालसम्मको प्रगति :
- ❖ कूल लागत : 71.7 million USD  
श्रोत- नेपाल सरकार  
– 26.6 million USD (20.5 GOV and 6.1 WUSC)  
वैदेशिक : 45.1 million USD ADB  
कूल : 71.7 million USD
- ❖ गत आ.व. सम्मको प्रगति : 90%
- ❖ यस आ.वको दोस्रो चौमासिक प्रगति: वित्तिय: ८०.३२%

भौतिक: ९१.४६%

अष्टमासिक भौतिक प्रगति: ७९.१० %

वित्तीय प्रगति: ५४.२९%

९. आयोजना प्रमुख: राम चन्द्र शाह (सु.ई)

खानेपानी तथा ढल निकास विभाग

### ३. तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना

- ❖ बजेट उपशिर्षक : (९३१३१०८) Loan 3157NEP
- ❖ उद्देश्य : ३ लाख ९० हजार जनसंख्यालाई गुणस्तरीय खानेपानी तथा आधारभूत सरसफाइको सुविधा पुऱ्याउने ।
- ❖ लागू जिल्ला : क्षेत्रीय कार्यालयहरु : धनकुटा/सुर्खेत/कास्की/ क्षेत्रीय आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, नेपालगन्ज, बाँके/इटहरी, सुनसरी, कञ्चनपुर/ भापा/ चितवन/ नवलपरासी/तनहुँ/ रुकुम/ सल्यान/नुवाकोट/ दोलखा/सुनसरी/इलाम/ सिरहा/सर्लाही/ उदयपुर/ खोटाङ्ग/ भोजपुर/ रौतहट/ कपिलवस्तु/ डडेल्धुरा
- ❖ दोस्रो चौमासिक अवधि सम्मको प्रगति : ६८.१४ %
- ❖ कूल लागत : 109. million USD  
श्रोत- नेपाल सरकार -27.7 million USD (23.1 GOV and 4.6 Water Users)  
वैदेशिक : 60 million USD (ADB), 20 million USD (OFID), 1.3 Million USD (Grant BIMGF)  
कूल : 109. million USD
- ❖ गत आ.व. सम्मको प्रगति : 23%
- ❖ यस आ.वको दोस्रो चौमासिक प्रगति: वित्तीय: ६८.८५%
  - भौतिक: ८०.८८%
  - अष्टमासिक भौतिक प्रगति: ७१.६०%  
वित्तीय प्रगति ६८.१४%

१०. आयोजना प्रमुख: राम चन्द्र शाह (सु.ई)

खानेपानी तथा ढल निकास विभाग

### ४. सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम

- ❖ बजेट उपशिर्षक: ३१३१११
- ❖ उद्देश्य
  - a. सहलगानी कार्यक्रम लेखा नेपानी तथा सरसफाइ सेवालाई आधारभूत स्तरसम्ममात्र सिमितनराखी जीवनयापनमा आएको परिवर्तन सापेक्ष उपभोक्तालाई छिटो रुपमा सुरक्षित, विश्वसनीय, पर्याप्त र दिगो सेवा उपलब्ध गराइ जीवनस्तर उकास्न टेवा पुऱ्याउने उद्देश्य राखेको छ । कार्यक्रमका अन्य उद्देश्यहरु निम्न वमोजिम छन्:
    - कार्यक्रममा सहभागी आयोजनाका उपभोक्ता संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको ज्ञान, सीप, क्षमता र दक्षता बृद्धी गरी व्यावसायिक ढंगले दिगो तथा आत्मनिर्भर सेवा संचालन गर्न सहयोग गर्ने।
    - खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको क्षेत्र तथा स्तर बृद्धी र व्यवस्थापनमा सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रको संलग्नता एवं लगानीको वातावरण तथा अवसर श्रृजना गर्न उपभोक्ता संस्थालाई सहयोग गर्ने।
    - स्वस्थ जीवन यापनमा खानेपानीको गुणस्तर र सरसफाइको महत्ववारे उपभोक्ताहरुको चेतना अभिवृद्धि गरी जागरुक बनाउने ।
    - खानेपानीको गुणस्तर कायम राख्न खानेपानी सुरक्षा योजना (Water Safety Plan) कार्यान्वयन गर्ने।

- ❖ लागू जिल्ला: दाङ्ग, झापा, मोरङ्ग, मकवानपुर, गोरखा, नवलपरासी, रूपन्देही, कैलाली, बागलुङ्ग, चितवन, जाजरकोट, लम्जुङ्ग, पर्वत, कास्की, वैतडी, तनहुँ, पाल्पा र भक्तपुर) गरी जम्मा १८ वटा जिल्ला)
- ❖ शुरू देखि हाल सम्मको प्रगति: ४ वटा आयोजनाहरू बोलपत्र आव्हान भएको तथा ८ आयोजनाहरूको DPR Final भई बोलपत्र आव्हान हुने क्रममा रहेको, ८ वटा आयोजनाहरूको DPR तयार गर्न consultant हरू सँग सम्झौता भएको, थप २ वटा आयोजनाहरूको DPR तयार गर्न RFP Issue गरी Consultant छनौट कार्य भै रहेको । ८ वटा नयाँ आयोजनाहरूको Feasibility Study का लागी परामर्शदाता छनौट भएको । क्रमागत आयोजनाहरूमा निर्माण कार्य सुचारु रहेको ।
- ❖ कूल लागत:  
श्रोत नेपाल सरकार-८०,२४,९९,००० (आ.व. २०७३/०७४)  
कूल: ८०,२४,९९,००० (आ.व. २०७३/०७४)  
गत आ.व. सम्मको प्रगति ४५%
- ❖ यस आ.वको प्रगति दोस्रो चौमासिक प्रगति: वित्तिय: ५२.७७%  
भौतिक: ८१.६२%  
अष्टमासिक भौतिक प्रगति: ८१.५४%  
वित्तिय प्रगति: ५२.२६%
- ❖ आयोजना प्रमुख: मिना श्रेष्ठ (सु.ई)  
खानेपानी तथा ढल निकास विभाग

#### ५. सुर्ख्खा क्षेत्र खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना

- ❖ बजेट उपशिर्षक: ३१३११२
- ❖ उद्देश्य: हिमाल, पहाड, तराई मधेश जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भौगोलिक विकटता र प्राकृतिक श्रोतका कारण पिउने पानीको अभाव झेलिरहेका नेपाली जनताहरूलाई स्वच्छ पिउने पानी तथा आधारभूत सरसफाईको सुविधा उपलब्ध गराई उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने नै यस आयोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
- ❖ लागू जिल्ला: काभ्रे गोरखा र सुर्खेत, पाल्पा, खोटाङ, पाँचथर, रामेछाप,
- ❖ कूल लागत: ४९५५९४५.१९ (रू हजारमा)  
श्रोत नेपाल सरकार:  
बैदेशिक: छैन  
कूल: ४९५५९४५.१९ (रू हजारमा) - नेपाल सरकार
- ❖ गत आ.व. सम्मको प्रगति: १०.२८%
- ❖ यस आ.वको दोस्रो चौमासिक प्रगति: वित्तिय: २५.०६%  
भौतिक: ६९.४५%
  - अष्टमासिक भौतिक प्रगति: ६४.०३ %  
वित्तिय प्रगति: १६.८७%
- ❖ आयोजना प्रमुख: दिपक महर्जन (इन्जिनियर)  
खानेपानी तथा ढल निकास विभाग

#### ६. तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम

- ❖ बजेट उपशिर्षक : ३१३११३
- ❖ उद्देश्य : तराइका २० जिल्लाहरूमा आर्सेनिक तथा अन्य प्रदुषणरहित खानेपानी उपलब्ध गराउने र स्यालो ट्यबवेलहरू विस्थापित गर्ने ।
- ❖ लागू जिल्ला : तराइका २० जिल्ला
- ❖ शुरू देखि हाल सम्मको प्रगति : विस्तृत सर्भेक्षण डिजाइनको लगभग ३०% कार्य भएको
- ❖ कूल लागत  
श्रोत- नेपाल सरकार: ३००५५८००० (आ व ७३/७४)

वैदेशिक :

कुल : ३००५५८०००

- ❖ गत आ. व. सम्मको प्रगतियसै आ व मा कार्यक्रम शुरु भएको :
- ❖ गत चौमासिक सम्मको प्रगति सर्भेक्षण कार्यक्रमको :consultant सँग सम्झौता सम्पन्न गरिएको ।
- ❖ आयोजना प्रमुख: अरुण कुमार सिमखडा (सि.डि.ई.)  
खानेपानी तथा ढल निकास विभाग

#### ७. ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजना

- ❖ बजेट उपशिर्षक- ३१३११५
- ❖ उद्देश्य (ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजना)-
- ❖ ग्रामीण क्षेत्रमा सुधारिएको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँचलाई वृद्धि गर्ने ।
- ❖ छनोट भएका जिल्लाहरूमा ग्रामीण समुदायले व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी आयोजनाहरूको दीगोपन प्रवर्धनका लागि दीर्घकालीन सहयोग संयन्त्र विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने ।  
लागू जिल्ला- ५५
- ❖ शुरुदेखि गत आ.व सम्मको प्रगति-भौतिक प्रगति-२४.८२%  
वित्तीय प्रगति- १६.४९%
- ❖ कूल लागत- ९० मिलियन अमेरीकी डलर  
श्रोत-नेपाल सरकार- १०.५मिलियन अमेरीकी डलर  
वैदेशिक- ७२ मिलियन अमेरीकी डलर  
समुदायको योगदान- ७.५ मिलियन अमेरीकी डलर  
कूल- ९० मिलियन अमेरीकी डलर
- ❖ गत आ.व. सम्मको प्रगति-भौतिक प्रगति-२४.८२%  
वित्तीय प्रगति- १६.४९%  
यस आ.वको दोस्रो चौमासिक अवधिको प्रगति: भौतिक प्रगति:६३%  
वित्तीय प्रगति:६१.४०%  
अष्टमासिक भौतिक प्रगति:४०%  
वित्तीय प्रगति:६६.८६%
- ❖ आयोजना प्रमुख: भूपेन्द्र अर्याल (कार्यकारी निर्देशक)

#### ८. काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना-( ए. डि. बी. ऋण नं. २७७६ र ३२५५)

- ❖ बजेट उपशिर्षक -५०११४५
- ❖ उद्देश्य-काठमाण्डौ उपत्यकाको खानेपानी संग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास तथा स्तरोन्नति गरी मेलम्ची खानेपानी आयोजना बाट प्राप्त पानीलाई समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइ उपत्यका वासी एवं अन्य उपभोक्ताहरूलाई दिगो तथा भरपर्दो स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइ जनस्वास्थ्य एवं जीवन स्तरमा अभिवृद्धि गर्ने साथै काठमाण्डौ उपत्यकाको शहरी वातावरणमा सुधार गर्ने
- ❖ लागू जिल्ला- काठमाण्डौ, भक्तपुर, ललितपुर
- ❖ कूल लागत  
श्रोत-नेपाल सरकार- ९५ मिलियन अमेरिकन डलर  
वैदेशिक- १७० मिलियन अमेरिकन डलर (ADB)  
कूल- २६५ मिलियन अमेरिकन डलर
- ❖ गत आ.व. सम्मको प्रगति- ५४ प्रतिशत
- ❖ आयोजना प्रमुख: तिरेश खत्री (सु.ई)  
आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय

#### ९. काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी ढल व्यवस्थापन आयोजना (ए. डि. बी. ऋण 3000)

- ❖ बजेट उपशिर्षक-५०११६७

- ❖ उद्देश्य- उपत्यकावासी उपभोक्ताहरूबाट उत्पादन भएको फोहर पानीलाई प्रशोधन गरी उपत्यकाका नदीहरूलाई प्रदुषणरहित बनाइ काठमाण्डौं उपत्यकाको शहरी वातावरणमा सुधार गरीजनस्वास्थ्य एवं जीवन स्तरमा अभिवृद्धि गर्ने ।
- ❖ लागू जिल्ला- काठमाण्डौ, भक्तपुर, ललितपुर
- ❖ शुरुदेखि हालसम्मको प्रगति- २.१६ प्रतिशत
- ❖ कूल लागत  
श्रोत- नेपाल सरकार- ४० मिलियन अमेरिकन डलर  
वैदेशिक- ९६ मिलियन अमेरिकन डलर (ADB)  
कूल- १३६ मिलियन अमेरिकन डलर
- ❖ गत आ.व. सम्मको प्रगति- १.१ प्रतिशत
- ❖ यस आ.बको दोस्रो चौमासिक अवधिको प्रगति: भौतिक प्रगति:५४%  
वित्तिय प्रगति:१५%  
अष्टमासिक भौतिक प्रगति:३०.२७%  
वित्तिय प्रगति:१०.१८%
- ❖ आयोजना प्रमुख: तिरेश खत्री (सु.ई)  
आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय

#### १०. मेलम्ची खानेपानी आयोजना

- ❖ बजेट उपशिर्षक -३१३११४
- ❖ उद्देश्य - काठमाण्डौं उपत्यकामा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराई उपत्यकावासीले भोग्दै आएको खानेपानीको दीर्घकालिन समस्या हटाउन र पानीजन्य रोगहरूबाट मुक्त गराई उपत्यकावासीको जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनु।
- ❖ लागू जिल्ला -काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलान्चोक
- ❖ शुरुदेखि हालसम्मको प्रगति - 88.83%
- ❖ कूल लागत - २,३४,५८,७०,०००।००  
श्रोत :  
नेपाल सरकार: ७०३७६००००।०० ADB/ JICA/ NDF  
वैदेशिक: ऋण - १५५५७२००००।०० ADB/ JICA/ NDF
- अनुदान -८६३९००००।००
- कूल- २,३४,५८,७०,०००।००
- ❖ यस आ.बको दोस्रो चौमासिक अवधिको प्रगति: भौतिक प्रगति:७४.७१%  
वित्तिय प्रगति:६५.४३%  
अष्टमासिक भौतिक प्रगति:७९.३४%  
वित्तिय प्रगति:५९.७५%
- ❖ आयोजना प्रमुख: रामचन्द्र देवकोटा (सु.ई)  
मेलम्ची खानेपानी आयोजना

#### ११. राष्ट्रिय सुचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन आयोजना

- ❖ बजेट उपशिर्षक -३१३१०१
- नेपाल सरकार: ११,१६१
- अनुदान -२,००० UNICEF
- ❖ यस आ.बको दोस्रो चौमासिक अवधिको प्रगति: भौतिक प्रगति:७०.९८%  
वित्तिय प्रगति:५७.७५%  
अष्टमासिक भौतिक प्रगति:६५.७६%  
वित्तिय प्रगति:३९.८८%
- ❖ आयोजना प्रमुख: जनक भुषण धौभडेल (सि.डि.ई)  
खानेपानी तथा ढल निकास विभाग



## १२. खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम

- ❖ बजेट उपशिर्षक -३१३१०२  
श्रोत :  
नेपाल सरकार: ९४१८०७१००
  - अनुदान-११२५०१०० UNICEF
- ❖ यस आ.बको दोस्रो चौमासिक अवधिको प्रगति: भौतिक प्रगति:५६.६३%  
वित्तिय प्रगति:३२.७%  
अष्टमासिक भौतिक प्रगति:७३.५९%  
वित्तिय प्रगति:२९.५%
- ❖ आयोजना प्रमुख: शेखर चन्द्र के.सी. (सि.डि.ई)  
खानेपानी तथा ढल निकास विभाग

## १३. डिप ट्युवेल आयोजना

- ❖ बजेट उपशिर्षक -३१३१०३  
श्रोत :  
नेपाल सरकार: ८९४३६१००
- ❖ यस आ.बको दोस्रो चौमासिक अवधिको प्रगति: भौतिक प्रगति:८३.९०%  
वित्तिय प्रगति:२५.६४%  
अष्टमासिक भौतिक प्रगति:८३.५३%  
वित्तिय प्रगति:२८.०७%
- ❖ आयोजना प्रमुख: विपिन कुमार ठाकुर (सि.डि.ई)  
खानेपानी तथा ढल निकास विभाग

## १४. जनसाधन विकास कार्यक्रम

- ❖ बजेट उपशिर्षक -३१३१०४  
श्रोत :  
नेपाल सरकार: ४१६४३१००
- ❖ यस आ.बको दोस्रो चौमासिक अवधिको प्रगति: भौतिक प्रगति:८०.५३%  
वित्तिय प्रगति:३२.२३%  
अष्टमासिक भौतिक प्रगति:८२.७८%  
वित्तिय प्रगति:३१.९२%
- ❖ आयोजना प्रमुख: कविन्द्र विक्रम कार्की (सि.डि.ई)  
खानेपानी तथा ढल निकास विभाग

## १५. खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम

- ❖ बजेट उपशिर्षक -३१३१०६  
श्रोत :  
नेपाल सरकार: ३८१५४२१००  
अनुदान:२४०००१०० UNICEF
- ❖ यस आ.बको दोस्रो चौमासिक अवधिको प्रगति: भौतिक प्रगति:७६.७९%  
वित्तिय प्रगति:३७.८८%  
अष्टमासिक भौतिक प्रगति:७२.५३%  
वित्तिय प्रगति:३१.८०%
- ❖ आयोजना प्रमुख: नारायण प्रसाद खनाल (सि.डि.ई)  
खानेपानी तथा ढल निकास विभाग

**१६. जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनिकरण तथा उपयुक्त प्रविधि प्रवर्द्धन आयोजना**

- ❖ बजेट उपशिर्षक -३१३१०९  
श्रोत :  
नेपाल सरकार:१०११८२।००
- ❖ यस आ.बको दोस्रो चौमासिक अवधिको प्रगति: भौतिक प्रगति: .८५.५०%  
वित्तिय प्रगति:४४.७७%  
अष्टमासिक भौतिक प्रगति:८५.९१%  
वित्तिय प्रगति:४१.०४%
- ❖ आयोजना प्रमुख: किरण दर्नाल (सि.डि.ई)  
खानेपानी तथा ढल निकास विभाग

**१७. ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम**

- ❖ बजेट उपशिर्षक -३१३११०  
श्रोत :  
नेपाल सरकार:२०२१३९।००
- ❖ यस आ.बको दोस्रो चौमासिक अवधिको प्रगति: भौतिक प्रगति: .६८.७८%  
वित्तिय प्रगति:४.९९%  
अष्टमासिक भौतिक प्रगति:६२.९%  
वित्तिय प्रगति:१९.७४%
- ❖ आयोजना प्रमुख: टिका बहादुर चौधरी (सि.डि.ई)  
खानेपानी तथा ढल निकास विभाग

**१८. खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम**

- ❖ बजेट उपशिर्षक -३१३८०२  
श्रोत :  
नेपाल सरकार:३०८०९९०।००  
ऋण:-४०००००।००
- ❖ यस आ.बको दोस्रो चौमासिक अवधिको प्रगति: भौतिक प्रगति: .८२.७९%  
वित्तिय प्रगति:५७.२५%  
अष्टमासिक भौतिक प्रगति:८३.११%  
वित्तिय प्रगति:५२%
- ❖ आयोजना प्रमुख: जिल्ला स्तरिय कार्यक्रम

**१९. उच्च मध्यमस्तरीय ठूला खानेपानी आयोजना**

- ❖ बजेट उपशिर्षक -३१३८०३  
श्रोत :  
नेपाल सरकार:८२५०००।००
- ❖ यस आ.बको दोस्रो चौमासिक अवधिको प्रगति: भौतिक प्रगति: .८२.६०%  
वित्तिय प्रगति:८३.२९%  
अष्टमासिक भौतिक प्रगति:७९.३८%  
वित्तिय प्रगति:६७%
- ❖ आयोजना प्रमुख: जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको अष्टमासिक तथा दोस्रो चौमासिक प्रगति समिक्षा (आ.व. २०७३/७४)  
समारोहमा माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय राज्यमन्त्रीज्यू तथा श्रीमान् सचिवज्यूवाट भएको निर्देशन ।

**माननीय मन्त्रीज्यूवाट भएको निर्देशन**

१. खानेपानी तथा सरसफाइ समन्धी काम गर्ने सम्पूर्ण निकाय तथा कार्यालयले विनियोजित रकम अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने ।
२. कार्यालय तथा निकायगत वेरुजुको फछ्चोट समयमै गरिनु पर्ने।थप वजेट चाहिने भएमा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वयको पहल समेत गर्ने हुँदा जसरी पनि जनतालाई खानेपानी तथा सरसफाइको सुविधा उपलब्ध गराउन सम्पूर्ण निकाय कटिबद्ध तथा प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने ।
३. खानेपानी महसुलको वक्यौता उठाउन काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड तत्पर भएर लाग्नुपर्ने। साथै यसको आवश्यक सहयोगको लागि मन्त्रालयले सहयोगीको भूमिका खेल्ने।
४. ODF घोषणा भएका जिल्लाहरुमा Post ODF Campaign लगाएतका कार्यहरु गरिएकै भएपनि अझै प्रभावकारी तथा जिम्मेवारी भएर लाग्नु पर्ने। अहिले सम्म जम्मा ३८ वटा जिल्ला मात्र ODF घोषणा भएकोले आगामी २०१७ डिसेम्बर सम्ममा नेपाललाई पूर्ण रुपमा ODF घोषणा गर्न कटिबद्ध भई लाग्नुपर्ने र सम्पूर्ण सरोकारवालालाई समेत यस कार्यमा संलग्न गराई गाउँ सहर र देशका सबै जनतालाई सरसफाइको पहुँच पुर्याउने ।


**माननीय राज्य मन्त्रीज्यूवाट भएको निर्देशन**

५. हाल ODF घोषणा हुनकालागी करिव १० वटा जिल्ला पाइपलाइनमा रहेको हुँदा ति जिल्लाहरुमा घोषणा गर्न निर्वाचनको आचार संहिताले रोकेको साथै अरु जिल्लामा समेत ODF Campaign रोकेको हुँदा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने तथा स्थानिय स्तरमा ODF लगाएतका कर््यलाई प्रोत्साहान गर्न खानेपानी तथा ढल निकास विभागले विशेष अग्रसिरता लिने ।
६. खानेपानी तथा सरसफाइको सुविधा मौलिक हकको रुपमा रहेको हुनाले जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यान्वयन पक्षमा गंभिरतापूर्वक ध्यान दिन सम्पूर्ण निकायहरु गम्भीर हुने ।
७. मेलम्चीको पानी काठमाण्डौ उपत्यकामा २०७४ दशै भित्रमा ल्याउन मेलम्ची खानेपानी विकास समिति लगायत आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय अझ सक्रियताका साथ लाग्ने। सुरुङ्ग खन्ने कार्यलाई तिव्रताकासाथ अगाडी वढाउने ।
८. हाल काठमाण्डौ उपत्यकामा मेलम्चीको खानेपानी पाइपलाईन विस्तारका लागि खनिएको सडकका कारण धुलोको मात्रा वढेको भन्ने जनताको गुनासो भएको हुँदा धुलो नियन्त्रण का लागि आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले सडकमा पानी हाल्ने, Otta Seal गर्ने लगायतका कार्यलाई तिव्रता दिने ।

**श्रीमान सचिवज्यूबाट भएको निर्देशन**

९. नेपाल खानेपानी संस्थानमा जनशक्तिको अभाव देखिएको साथै भएका जनशक्ती पनि दक्ष नभएको हुँदा कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्ने ।
१०. खानेपानी वितरण तालिका सार्वजनिक गर्ने ।
११. खानेपानी चुहावट नियन्त्रण गर्ने, वक्यौता महशुल उठाउने, कम्प्युटर विलिङ्ग र अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने जस्ता कार्यहरुमा सबै निकायहरु समन्वय गरि लाग्ने ।
१२. सबै निकायहरुले सामाजिक संजाल लगाएत निकायगत वेवसाइट मार्फत सूचना जनतालाई प्रवाह गर्ने । साथै सेवाग्राहीवाट आउने गुनासा एवं प्रतिक्रियाहरुलाई अनलाइन टोलफ्रि, सामाजिक संजाल र अन्य प्रकृया मार्फत संवोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१३. खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको अष्टमासिक तथा दोस्रो चौमसिक प्रगति पुस्तिका प्रकाशन गर्ने ।

# खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको संगठन तालिका

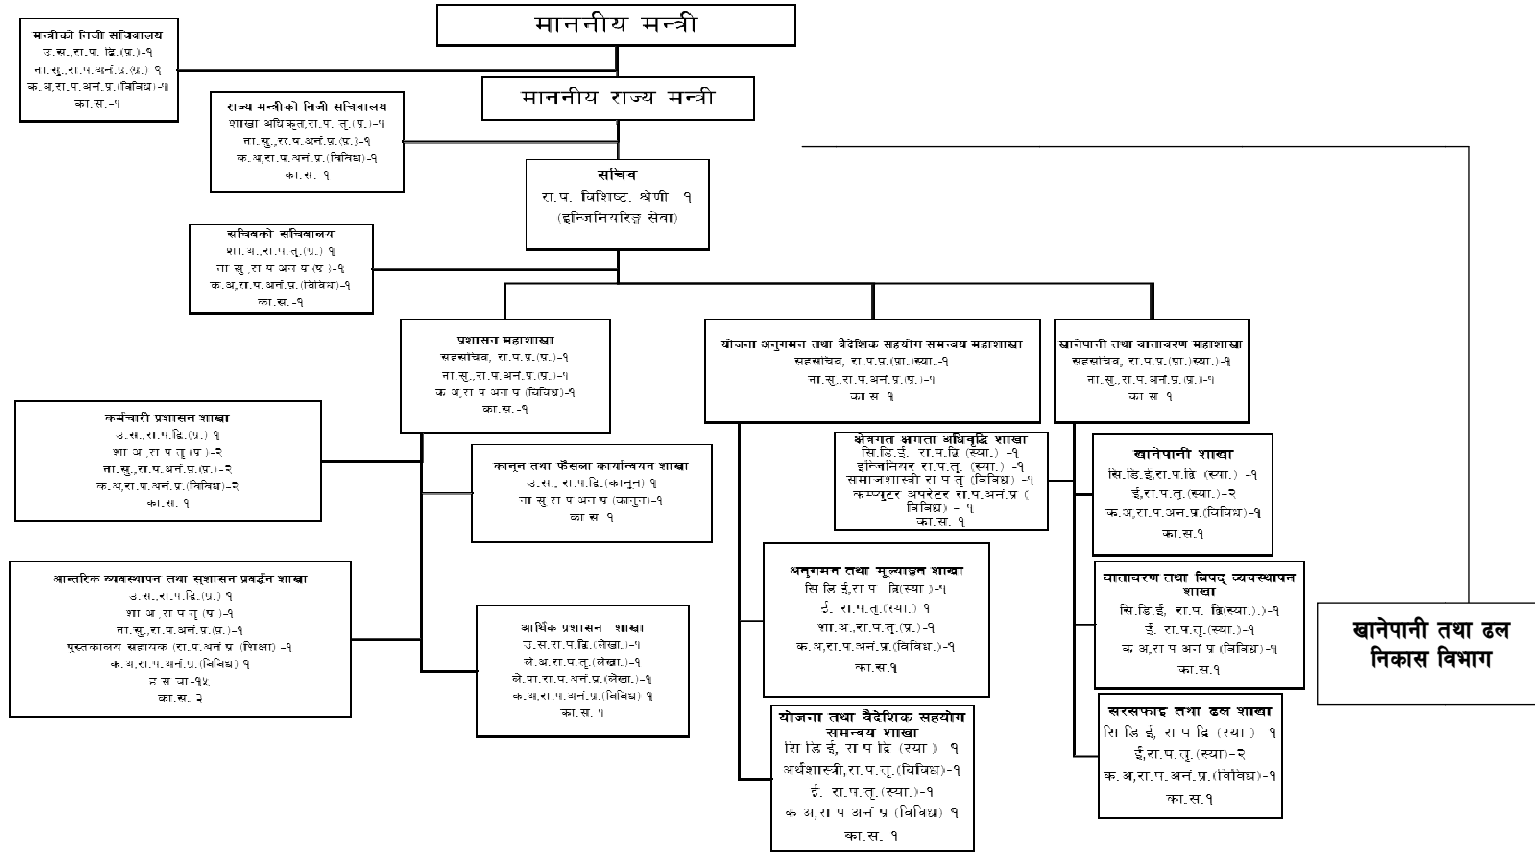

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका पदाधिकारी/कर्मचारीहरूको विवरण

महाशाखा / शाखा	पदाधिकारी/कर्मचारीको नाम	पद	कार्यालय	मोबाइल नं.	कैफियत	
माननीय खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री	जीवन बहादुर शाही	मा. मन्त्री	४२११५६५			
	मिन बहादुर रोकाय	नासु.				
		क.अ.				
	दिपक अधिकारी	कार्यालय सहयोगी		९८४३१३५१४१		
माननीय राज्यमन्त्रीज्यूको सचिवालय	दिपक खड्का	मा.राज्य मन्त्री	४२११६५१	९८५१०५३९१९		
	एकनाथ वास्तोला	शाखा अधिकृत				
	अरुण सिग्देल	नायव सुब्बा		९८४९२०९७९६		
	गोमा भूजेल	कार्यालय सहयोगी		९८४४२८८५४४		
	सिता खड्का	कार्यालय सहयोगी		९८४१६११५७५		
सचिवज्यूको सचिवालय	भीमप्रसाद उपाध्याय	सचिव	४२११६९३	९८५११०४०५७		
	आराम विक्रम शाह	शाखा अधिकृत	४२११६९३	९८४१८९१०११		
	धर्मराज खड्का	कम्प्युटर अपरेटर		९८४१४०६१३०		
	शान्ता खनाल	कार्यालय सहयोगी		९८४१०७३५७८		
	अर्जुन प्रसाद फुँयाल	कार्यालय सहयोगी		९८६०२६१९३४		
	रामकृष्ण गिरी	कार्यालय सहयोगी		९८२४१४८२०३		
	भक्त बहादुर कुँवर	ह.स.चा.		९८६१९६८७८५		
प्रशासन महाशाखा	प्रशासन महाशाखा	शंकरप्रसाद सुवेदी	सहसचिव	४२००५०७	९८४१३४५५४२	
		एलिना ढकाल	कम्प्युटर अपरेटर		९८४९६५६२४२	
			नायव सुब्बा			
		प्रतिमा तिवारी	कार्यालय सहयोगी		९८४३४७५१३८	
		दुर्गा परियार	ह.स.चा.		९८४१०८५१२४	
	कर्मचारी प्रशासन शाखा	टोलराज उपाध्याय	उपसचिव	४२००५५६	९८४७६३३२७७	
		रमेश पाण्डेय	शाखा अधिकृत	४२००५००	९८४१८३१४३१	
		शम्भु भण्डारी	नायव सुब्बा	४२७०३९२	९८४१३४०१३४	
		बुद्धि जिरेल	क.अ.		९८४३८१८४१०	
		सरस्वती अर्याल	क.अ.		९८४९०३५७७७	
		सुष्मा श्रेष्ठ	क.अ.		९८४९०७६७६०	
		रिना दहाल	सो.मो.		९८४३७८७८९६	
		अवध राजवंशी	कार्यालय सहयोगी		९८१३८५३७२९	
		पार्वती ओली	कार्यालय सहयोगी		९८०८३६४०३९	
		अनुपमा रिजाल	कार्यालय सहयोगी		९८१८९८४६६६	
		प्रदिप कुमार खाँ	कार्यालय सहयोगी		९८४३७५२७०६	
		सविना तामाङ्ग	कार्यालय सहयोगी		९८०८१५८००१	
		पदम बहादुर तामाङ्ग	ह.स.चा.		९८४००१७३९६	
		आन्तरिक	पुष्पराज पौडेल	उप सचिव	४२११५४२	९८४६३२५३३५

महाशाखा / शाखा	पदाधिकारी/कर्मचारीको नाम	पद	कार्यालय	मोबाइल नं.	कैफियत		
योजना अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा	व्यवस्थापन शाखा	केदारनाथ भट्टराई	शाखा अधिकृत	४२००३९२	९८४३७८६३४४		
		दिपेन्द्र के.सी	नायब सुब्बा		९८४८०२४६३८		
		राम पाठक	कम्प्युटर अपरेटर		९८४९७७३६३९		
		सुनिल पौडेल	कम्प्युटर अपरेटर		९८५१०१५४८३		
		युवराज सिंह	कार्यालय सहयोगी		९८४८३९९१७१		
		गिता बस्नेत (कार्की)	कार्यालय सहयोगी		९८६०२३८८९५		
		अमृत कुमार श्रेष्ठ	कार्यालय सहयोगी		९८४१०९२६८३		
		सुरेश महर्जन	ह.स.चा.		९८०८१०७५		
	अर्थिक प्रशासन शाखा	प्रकाश पुडासैनी	उपसचिव(लेखा)	४२००५५५	९८५११७१४६१		
			लेखा अधिकृत	४२००५५५			
		प्रदिप शर्मा	लेखापाल		९८५५०३३३०८		
		साधुराम सरदार	कार्यालय सहयोगी		९८४२१४४३६५		
	कानून तथा फौसला कार्यान्वयन शाखा	उपेन्द्र केशर खनाल	उपसचिव(कानून)	४२००५००	९८४१५७०७८३		
		निर्मला कार्की	नायब सुब्बा ( कानून)		९८४१६०७११०		
		रामकृष्ण तामाङ्ग	ह.स.चा.		९८४१९३६४०६		
	योजना अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा	महाशाखा	आशिष घिमिरे	सहसचिव (स्या.)	४२००५०६	९८४१२३१८२५	
			धविन्द्र वीक	ना.सु.		९८४३२९६८१९	
			मञ्जू श्रीस्वंगमिखा	कार्यालय सहयोगी		९८६००६९८९५	
			जिवन राना	ह.स.चा.			
		योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा	दिनेश अधिकारी	सि.डि.ई. (स्या.)	४२००३९२	९८५११३३२३८	
			कमलकान्त पौडेल	अर्थशास्त्री		९८५११२८८७०	
किरण आचार्य			इन्जिनियर (स्या.)	४२००३९२	९८४१५१८४४४		
अनित कुमार रसाइली			कम्प्युटर अपरेटर		९८४५१६७३३		
केशरी ताम्राकार			सो.मो.		९८४९०७८५१८		
कृष्णकुमार चौधरी			ह.स.चा.		९८६०३१५७२०		
अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा			सि.डि.ई. (स्या.)	४२११२१८			
		नरेश रेग्मी	इन्जिनियर (स्या.)		९८४६२४०५३३		
			शाखा अधिकृत				
		स्मृती हमाल ठकुरी	कम्प्युटर अपरेटर		९८०३१५१३४४		
खानेपानी तथा वातावरण महाशाखा	खानेपानी तथा वातावरण महाशाखा	राजन राज पाण्डे	सहसचिव (स्या.)	४२००३९२	९८४१२८५५९३		
		नवराज प्रसाद न्यौपने	नायब सुब्बा	४२००३९२	९८४१८४९९३३		
		विशाल घिमिरे	कम्प्युटर अपरेटर		९८४११७३२३१		
		विनिता मगर	कार्यालय सहयोगी		९८४३२७४६८		
		नवराज	ह.स.चा.				
	खानेपानी शाखा	हरिप्रसाद तिम्बिलिसना	सि.डि.ई. (स्या.)	४२००५४६	९८५१०७५५३३		
		मधुसुधन खनाल	इन्जिनियर (स्या.)	४२००५४७	९८४९९७७९३१		

महाशाखा / शाखा	पदाधिकारी/कर्मचारीको नाम	पद	कार्यालय	मोबाइल नं.	कैफियत	
	सुष्मा काफ्ले	इन्जिनियर (स्या.)		९८४३०६१९८२		
	अन्जु गैरे	क.अ.		९८०३४४४८८९		
	कृष्ण केसी.	ह.स.चा.		९८४३०९९७४९		
	वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा	शंकर ज्ञावली	सि.डि.ई. (स्या.)		९८४९२७८०४८	
		विदुर झा	इन्जिनियर (स्या.)		९८४९४३२३२८	
			इन्जिनियर (स्या.)			
	क्षेत्रगत समन्वय तथा क्षमता अभिवृद्धि शाखा	सुरेश महाजु	सि.डि.ई. (स्या.)	४२००५३६	९८५९०९७७३०	
		प्रयाश घिमिरे	इन्जिनियर (स्या.)		९८५९९४९५००	
		रिक्त	समाज शास्त्री			
		परमेश्वर सिलवाल	कार्यालय सहयोगी		९८४३४९४७९०	
	सरसफाई तथा ढल शाखा	रिक्त	सि.डि.ई. (स्या.)			
		शेखर खनाल	इन्जिनियर (स्या.)	४२००५४७	९८४९८९९७८२	
		इन्जिनियर (स्या.)				



**मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूको (जिम्मेवारी अधिकारहरूको जानकारी विवरण)  
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय**

सि. न	ब.उ.शी.न.	आयोजना/कार्यक्रम	आयोजना प्रमुख				आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय
			नाम	पद	इमेल	फोन	
१	३१३११६	वातावरणिय सरसफाई आयोजना	श्री प्रेम कृष्ण श्रेष्ठ	शाखा प्रमुख(सि.डि.ई.)	pshrestha97@yahoo.com	९८४१२७०८६९	विभाग / डिभिजन / सब डिभिजन कार्यालय
२	३१३१०१	राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन आयोजना	श्री जनक भूपण धौमडेल	शाखा प्रमुख(सि.डि.ई.)	info@dwss.gov.np	९८४१५३२६०२	विभाग / डिभिजन / सब डिभिजन कार्यालय
३	३१३१०२	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रम	श्री शेखरचन्द्र के.सी.	शाखा प्रमुख(सि.डि.ई.)	shekharckc@gmail.com	९८४१२७३७८१	विभाग / डिभिजन / सब डिभिजन कार्यालय
४	३१३१०३	डिप ट्यूबेल आयोजना (मर्मत सुधार)	श्री विपिन कुमार ठाकुर	शाखा प्रमुख(सि.डि.ई.)	bipinthakur98493@gmail.com	९८४९३६१५६७	विभाग / डिभिजन / सब डिभिजन कार्यालय
५	३१३१०४	जनसाधन विकास कार्यक्रम	श्री कविन्द्र विक्रम कार्की	शाखा प्रमुख(सि.डि.ई.)	kb.karki@gmail.com	९८४९१९१२७६	विभाग
६	३१३१०६	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	श्री नारायण प्रसाद खनाल	शाखा प्रमुख(सि.डि.ई.)	naprakh@gmail.com	९८४१२१२३०३	विभाग / डिभिजन / सब डिभिजन कार्यालय
७	३१३१०९	जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनिकरण तथा उपयुक्त प्रविधि प्रवर्द्धन आयोजना	श्री किरण दर्नाल	शाखा प्रमुख(सि.डि.ई.)	darnalk@hotmail.com	९८४१५८४११२	विभाग / डिभिजन / सब डिभिजन कार्यालय
८	३१३११०	ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम	श्री टीका बहादुर चौधरी	शाखा प्रमुख(सि.डि.ई.)	ertchaudhari@gmail.com	९८४१६८७८८६	विभाग / डिभिजन / सब डिभिजन कार्यालय
९	३१३१०७	दोश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	श्री राम चन्द्र शाह	आयोजना प्रमुख	rcsah20@yahoo.com	९८४९९२३९३२	आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय
	३१३१११	खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कार्यक्रम	श्री मीना श्रेष्ठ	आयोजना प्रमुख	sthameena@yahoo.com	९८४१८२८९१३	आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय
१०	३१३११२	सुक्खाक्षेत्र (रामेछाप बृहत, पकरवास, तिमाल र यासोक) खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	दिपक महर्जन	ईन्जिनयर	azwsp@dwss.gov.np	९८४१४८७७८७	आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय
११	३१३११३	तराइ मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम	श्री अरुण कुमार सिमखडा	शाखा प्रमुख(सि.डि.ई.)	arunsimkhada@gmail.com	९८४१२०१७७५	विभाग / डिभिजन / सब डिभिजन कार्यालय
१२	३१३१०८	तेस्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	श्री राम चन्द्र शाह	आयोजना प्रमुख	rcsah20@yahoo.com	९८४९९२३९३२	आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय
१३	३१३८०१	ग्रामीण खानेपानी आयोजना	मदन भट्ट	Programme Manager	rubika.shrestha@helvetas.org.np	९८५८०५१९०२	हेल्पेटास नेपाल
१४	३१३८०२	खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	श्री अरुण कुमार सिमखडा	शाखा प्रमुख(सि.डि.ई.)	arunsimkhada@gmail.com	९८४१२०१७७५	विभाग / डिभिजन / सब डिभिजन

चौमासिक तथा अष्टमासिक प्रतिवेदन / ४०

सि. न	ब.उ.शी.न.	आयोजना/कार्यक्रम	आयोजना प्रमुख				आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय
			नाम	पद	इमेल	फोन	
							कार्यालय
१५	३१३८०३	उच्च /मध्यमस्तरीय ठूला खानेपानी आयोजनाहरू	श्री अरुण कुमार सिमखडा	शाखा प्रमुख(सि.डि.ई.)	arunsimkhada@gmail.com	९८४१२०१७७५	विभाग / डिभिजन / सब डिभिजन कार्यालय
१६	३१३०१२	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	श्री शेखरचन्द्र के.सी.	शाखा प्रमुख(सि.डि.ई.)	shekharck@gmail.com	९८४१२७३७८१	विभाग
१७	५०११२८	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	संजीव विक्रम राणा	कार्यकारी निर्देशक	sanjeevrana55@gmail.com	९८५१०६९५४६	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड
१८	५०११७७	ढल प्रशोधन केन्द्र					
१९	३१३११४	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	रामचन्द्र देवकोटा	सहसचिव	rcdevkota1960@gmail.com	९८५११९५०४४	मेलम्ची खानेपानी विकास समिति
२०	३१३११५	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	भुपेन्द्र अर्याल	कार्यकारी निर्देशक	aryalbupendra@gmail.com	९८४३५८३४९५	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति
२१	५०११३५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना निर्देशनालय	तिरेश प्रसाद खत्री	आयोजना निर्देशक सु.ई)	ktires@gmail.com	९८५११२६२४५	आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय
२२	५०११४५(क)	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना					
२३	५०११४५(ख)	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना					
२४	५०११६७	काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना					
२५	५०११२६	खानेपानी उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम	अर्जुन बाबु ढकाल		nwscgeneralmanager@gmail.com	९८४१२४९६४४	नेपाल खानेपानी संस्थान
२६	५०११२७	खानेपानी तथा ढल निकास कार्यक्रम					

